

防災行政無線（同報系）更新工事の進捗状況について

1 これまでの経過

令和 7 年 4 月から毎月 1 回、工事請負事業者、工事監理事業、町担当者の 3 者による定例打合せを行い、主に下記内容の課題整理や進捗確認を実施している。

- (1) 現地調査、施工方法の検討、その他課題整理
- (2) 電波法に関する免許申請手続（関東総合通信局）
- (3) 工事工程の調整

2 工事の概要及び進捗

本工事における概要は下記のとおり。なお、現在までに旧機器からの切替えを実施し、本庁舎における親局工事は完成、新しい親局での運用を開始している。

また、屋外拡声子局の工事についても 10 月下旬から着工している。子局の工事は令和 8 年 2 月中に完了し、3 月中に完成検査を行う予定。概要は下記のとおり。

(1) 親局工事

- ・ 本庁舎の基地局、操作卓及びその他周辺機器の更新（本庁舎：完了）
- ・ 本庁舎及び消防本部の遠隔制御装置の更新（11 月下旬完了予定）
- ・ 大磯中学校の非常用可搬型親局装置の更新（大磯中学校：日程調整中）

○ 本庁舎の基地局、操作卓及びその他周辺機器の設置状況



(2) 屋外拡声子局工事（町内各地で着工中：令和7年10月下旬から令和8年2月末頃）


- ・ 柱の新設、建替、撤去
- ・ スピーカー、アンテナ、受信機、バッテリー等の装柱

○ スピーカー設置工事の状況

本庁舎屋上



消防署屋上

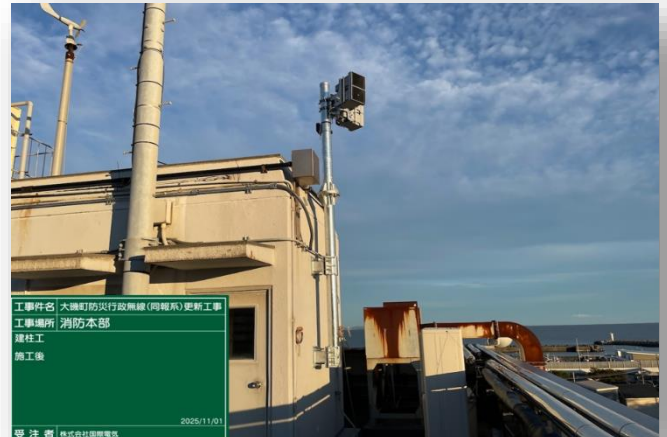

3 工事用材料検査

主要材料については、工場にて員数、規格、性能等の確認検査を行ったほか、その他納入材料についても随時検査を行っている。



R7. 9. 19（金）材料検査（高性能スピーカー）



R7. 9. 24（水）材料検査（主要材料・仙台工場）



R7. 10. 21（火）材料検査（鋼管柱）

4 今後の工事予定

別紙資料2「進捗工程管理表（実施工程表）」を参照
