

報 告 第 1 ～ 4 号 参 考 資 料

平成 30 年 5 月 31 日

平成 29 年度継続費・繰越明許費・事故繰越し繰越計算書について

資 料

平成 29 年度大磯町下水道事業特別会計継続費繰越計算書概要説明

【報告第 1 号】…… 1 ～ 2

[公共下水道整備事業]（下水道課）

平成 29 年度 大磯町一般会計繰越明許費繰越計算書概要説明

【報告第 2 号】…… 3 ～ 7

[農業振興普及事業]（産業観光課）

[大磯港みなとオアシス推進事業]（産業観光課）

平成 29 年度 大磯町一般会計事故繰越し繰越計算書概要説明

【報告第 3 号】…… 8 ～ 13

[幹線 21 号線整備事業]（建設課）

[国府本郷西小磯 1 号線整備事業]（建設課）

[生沢月京 1 号線整備事業]（建設課）

平成 29 年度 大磯町下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書概要説明

【報告第 4 号】…… 14 ～ 15

[公共下水道維持管理事業]（下水道課）

平成29年度 大磯町下水道事業特別会計継続費繰越計算書 概要説明

1. 事業名

050 公共下水道整備事業

2. 予算科目

(款) 2. 事業費 (項) 1. 下水道建設費 (目) 1. 下水道建設費
(節) 13 委託料 (細節) 16 設計監理委託料
(節) 15 工事請負費 (細節) 01 工事請負費

3. 事業概要

国府新宿地内において工事延長436mの区間に雨水管を推進工法により布設する。

(現場技術監理)

- ・契約工期(当初)：平成29年12月19日～平成31年3月28日
- ・契約業者：公益財団法人 神奈川県都市整備技術センター

(工事)

- ・契約工期(当初)：平成29年11月29日～平成31年3月15日
- ・契約業者：株式会社 入江建設

4. 所管課

下水道課

5. 事業経過・繰越理由

本事業は、平成29年度及び平成30年度の継続事業で雨水管を整備するものである。工事ヤード付近の発進立坑を築造するにあたり、占用物件(水道管φ350mm)の移設について神奈川県企業庁平塚水道営業所との移設位置の見直し協議に日数を要し移設工事が遅れたことにより、本事業の出来高金額が予定した年割額を満たすことができなくなった。

これにより、平成30年度に残額を繰り越して使用することができるように、繰り越しの手続きを行ったものである。

(現場技術監理)

- ・完了(予定)日：平成31年3月28日


(工事)

- ・完了(予定)日：平成31年3月15日

6. 位置図

別紙

位置図

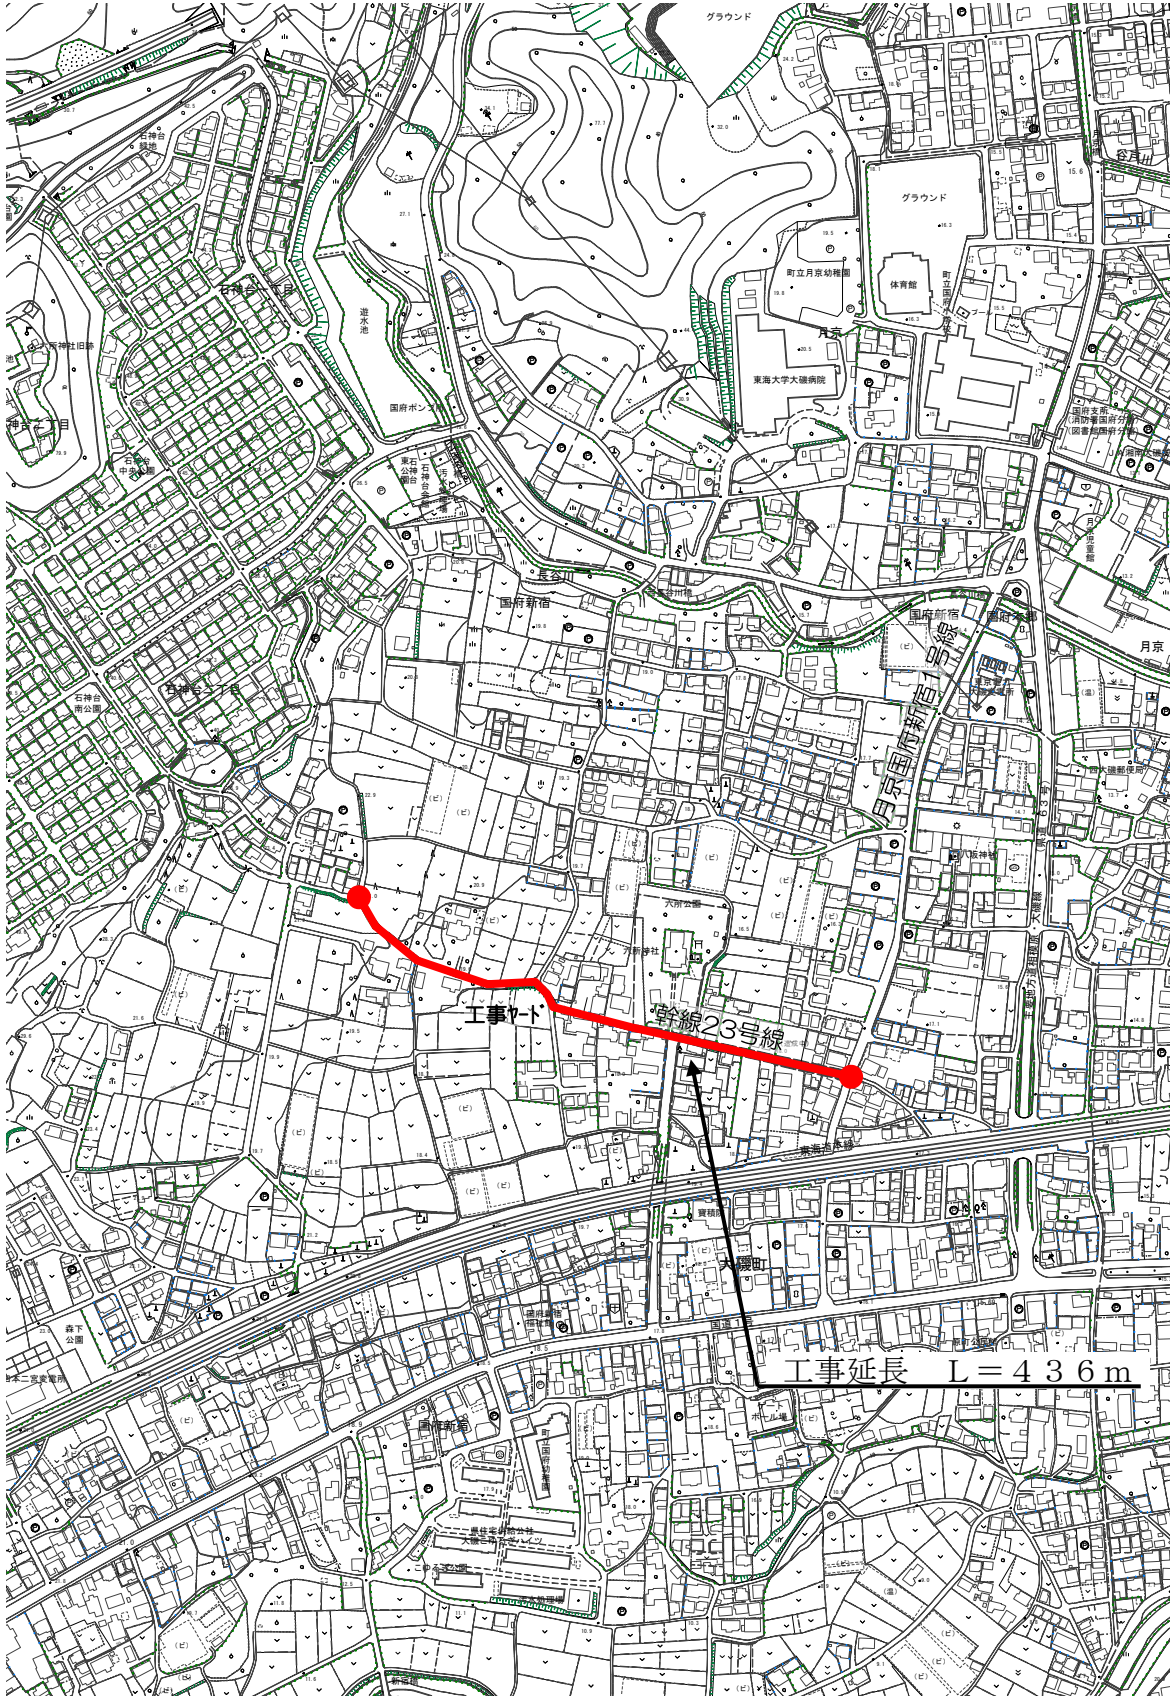

件名	雨水管整備工事（その4）
工事場所	大磯町 国府新宿 地内

平成29年度 大磯町一般会計繰越明許費繰越計算書 概要説明

1. 事業名

001 農業振興普及事業

2. 予算科目

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費 (目) 3. 農業振興費
(節) 13 委託料 (細節) 01 事業委託料

3. 事業概要

平成28年度に実施した基礎調査を基に、農用地の区域設定等を定める農業振興地域整備計画の変更を行う。

- ・契約工期(当初)：平成29年5月30日～平成30年3月16日
- ・契約業者：株式会社 農業経営研究所

4. 所管課

産業観光課

5. 事業経過・繰越理由

農業振興地域整備計画の見直しに伴う県との協議に日数を要し、年度内に事業を完了することができないため、平成30年度に当該予算を繰り越して使用することができるように、繰越明許費の議決(別紙議案写)を得たものである。

- ・変更契約工期：平成29年5月30日～平成30年10月31日
- ・完了(予定)日：平成30年10月31日

平成29年度 大磯町一般会計繰越明許費繰越計算書 概要説明

1. 事業名

050 大磯港みなとオアシス推進事業

2. 予算科目

(款) 8. 土木費 (項) 6. 港湾費 (目) 1. 港湾管理費
(節) 13 委託料 (細節) 30 P F I 等アドバイザー委託料

3. 事業概要

大磯港に賑わい交流施設を整備し、大磯港周辺及びみなと下町一帯を「みなとオアシス」として登録することで、人や情報の交流、賑わいの創出、マチナカへの賑わいの拡大を図るため、「賑わい創出施設」における指定管理者の募集、選定、協定締結等に係る各種支援業務を行う。

- ・契約工期（当初）：平成29年6月26日～平成30年3月16日
- ・契約業者：八千代エンジニアリング株式会社 横浜センター

4. 所管課

産業観光課

5. 事業経過・繰越理由

賑わい交流施設の整備に係る関係団体との協議に日数を要し、年度内に事業を完了することができないため、平成30年度に当該予算を繰り越して使用することができるように、繰越明許費の議決（別紙議案写）を得たものである。

- ・変更契約工期：平成29年6月26日～平成30年6月29日
- ・完了（予定）日：平成30年6月29日

6. 位置図

別紙

位置図



件名	大磯港みなとオアシス（賑わい交流施設）整備事業アドバイザー業務委託
委託場所	大磯町 大磯 地内 大磯港



【繰越明許費 議案写】

議案第15号

平成29年度大磯町一般会計補正予算（第5号）

平成29年度大磯町の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ48,356千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,443,559千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

- 第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

- 第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

平成30年2月15日提出

大磯町長 中 崎 久 雄

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興普及事業	2,500
8 土木費	6 港湾費	大磯港みなとオアシス 推進事業	16,000

平成29年度 大磯町一般会計事故繰越し繰越計算書 概要説明

1. 事業名

052 幹線21号線整備事業

2. 予算科目

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費 (目) 3. 道路新設改良費
(節) 22 補償、補填及び賠償金 (細節) 01 補償費

3. 事業概要

二級河川不動川改修事業で行う国府橋の架け替えに伴い、町道の拡幅整備を行う。

(借家人補償契約)

・契約日：平成29年12月18日

(物件除去契約)

・契約日：平成29年12月19日

4. 所管課

建設課

5. 事業経過・繰越理由

借家人の移転に日数を要し、建物の明け渡し及び建物所有者の物件除却を年度内に完了することができなくなった。これにより、平成30年度に当該予算を繰り越して使用することができるように、繰り越しの手続きを行ったものである。

(借家人補償契約)

・完了日：平成30年5月11日

(物件除去契約)

・完了(予定)日：平成30年6月30日

6. 位置図

別紙

位置図



件名	幹線21号線整備事業
工事場所	大磯町 月京 地内

平成29年度 大磯町一般会計事故繰越し繰越計算書 概要説明

1. 事業名

054 国府本郷西小磯1号線整備事業

2. 予算科目

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費 (目) 3. 道路新設改良費
(節) 15 工事請負費 (細節) 01 工事請負費

3. 事業概要

国府本郷西小磯1号線の拡幅等の整備を行う事業で、用地協力が得られた箇所から、整備工事を行う。

- ・契約工期(当初)：平成29年11月20日～平成30年3月16日
- ・契約業者：扶桑建設株式会社 大磯営業所

4. 所管課

建設課

5. 事業経過・繰越理由


事業用地の取得に伴い、関係地権者より隣接する土地を代替地としたい意向があったため、代替地の境界確定作業に日数を要し、本工事の施工範囲内で予定されていた神奈川県企業庁平塚水道営業所が行う水道管理設工事との工程調整の結果、年度内に工事を完了することができなくなった。これにより、平成30年度に当該予算を繰り越して使用することができるように、繰り越しの手続きを行ったものである。

- ・変更契約工期：平成29年11月20日～平成30年3月31日
- ・変更契約工期(最終)：平成29年11月20日～平成30年6月29日
- ・完了(予定)日：平成30年6月29日

6. 位置図

別紙

位置図

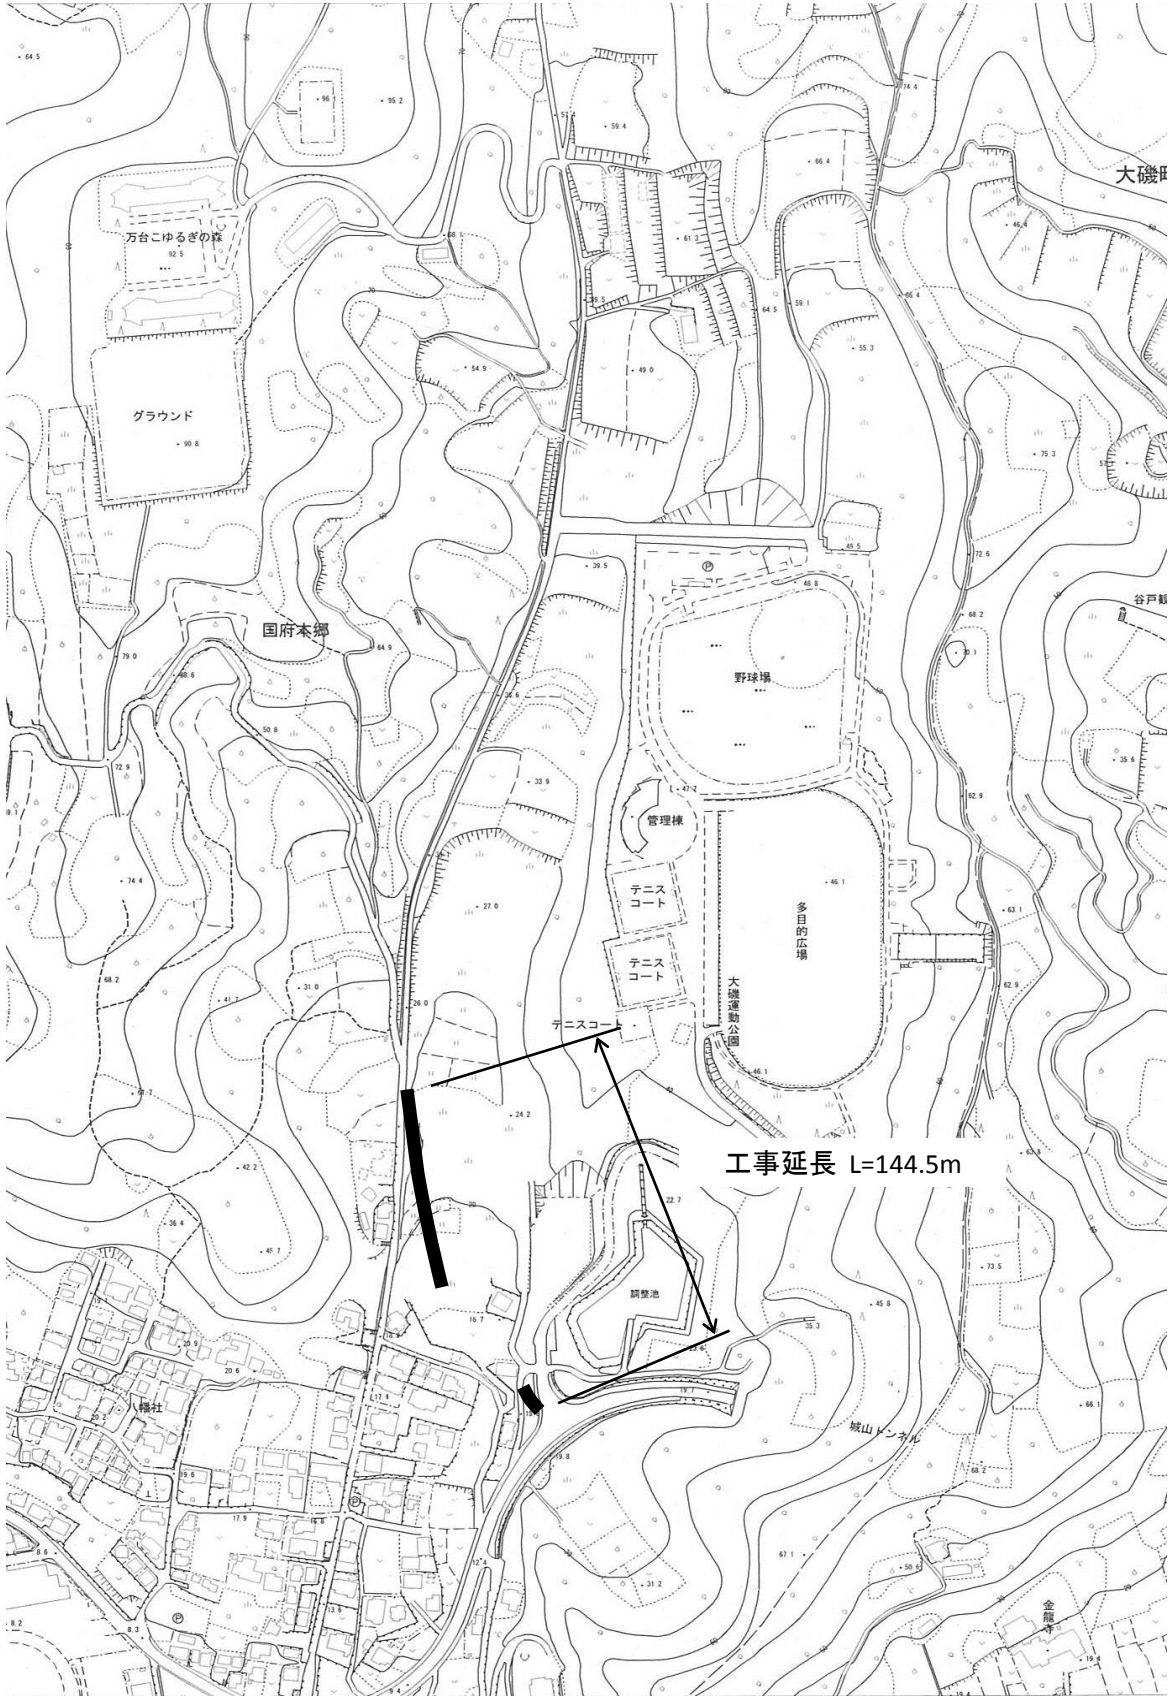

件名	国府本郷西小磯1号線整備工事
工事場所	大磯町 国府本郷 地内

平成29年度 大磯町一般会計事故繰越し繰越計算書 概要説明

1. 事業名

057 生沢月京1号線整備事業

2. 予算科目

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費 (目) 3. 道路新設改良費
(節) 22 補償、補填及び賠償金 (細節) 01 補償費

3. 事業概要

二級河川不動川改修事業に伴い、町道の拡幅整備を行う。

(借家人補償契約)

・契約日：平成30年2月26日

(物件除去契約)

・契約日：平成30年2月20日

4. 所管課

建設課

5. 事業経過・繰越理由

借家人の移転に日数を要し、建物の明け渡し及び建物所有者の物件除却を年度内に完了することができなくなった。これにより、平成30年度に当該予算を繰り越して使用することができるように、繰り越しの手続きを行ったものである。

(借家人補償契約)

・完了日：平成30年5月11日

(物件除去契約)

・完了(予定)日：平成30年9月30日

6. 位置図

別紙

位置図



件名	生沢月京1号線整備事業
工事場所	大磯町 月京 地内

平成29年度 大磯町下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書 概要説明

1. 事業名

001 公共下水道維持管理事業

2. 予算科目

(款) 1. 総務費 (項) 1. 下水道総務費 (目) 2. 施設管理費
(節) 15 工事請負費 (細節) 01 工事請負費

3. 事業概要

石神台地区における汚水管 L=44m 及び取付管 90 箇所について、布設替え工事を行う。

- ・契約工期（当初）：平成29年11月20日～平成30年3月16日
- ・契約業者：有限会社 蒔田建設

4. 所管課

下水道課

5. 事業経過・繰越理由


本工事は、調査結果に基づき汚水管及び取付管の布設替えを開削工法により行うものである。取付管の布設替え工事を施工するにあたり、各地権者に宅地内の排水の使用を一時停止してもらう必要があることから、工事施工日の日程調整等に日数を要し、年度内に完了することができなくなった。これにより、平成30年度に当該予算を繰り越しで使用することができるように、繰り越しの手続きを行ったものである。

- ・変更契約工期：平成29年11月20日～平成30年3月31日
- ・変更契約工期（最終）：平成29年11月20日～平成30年5月18日
- ・完了日：平成30年5月18日

6. 位置図

別紙

位置図

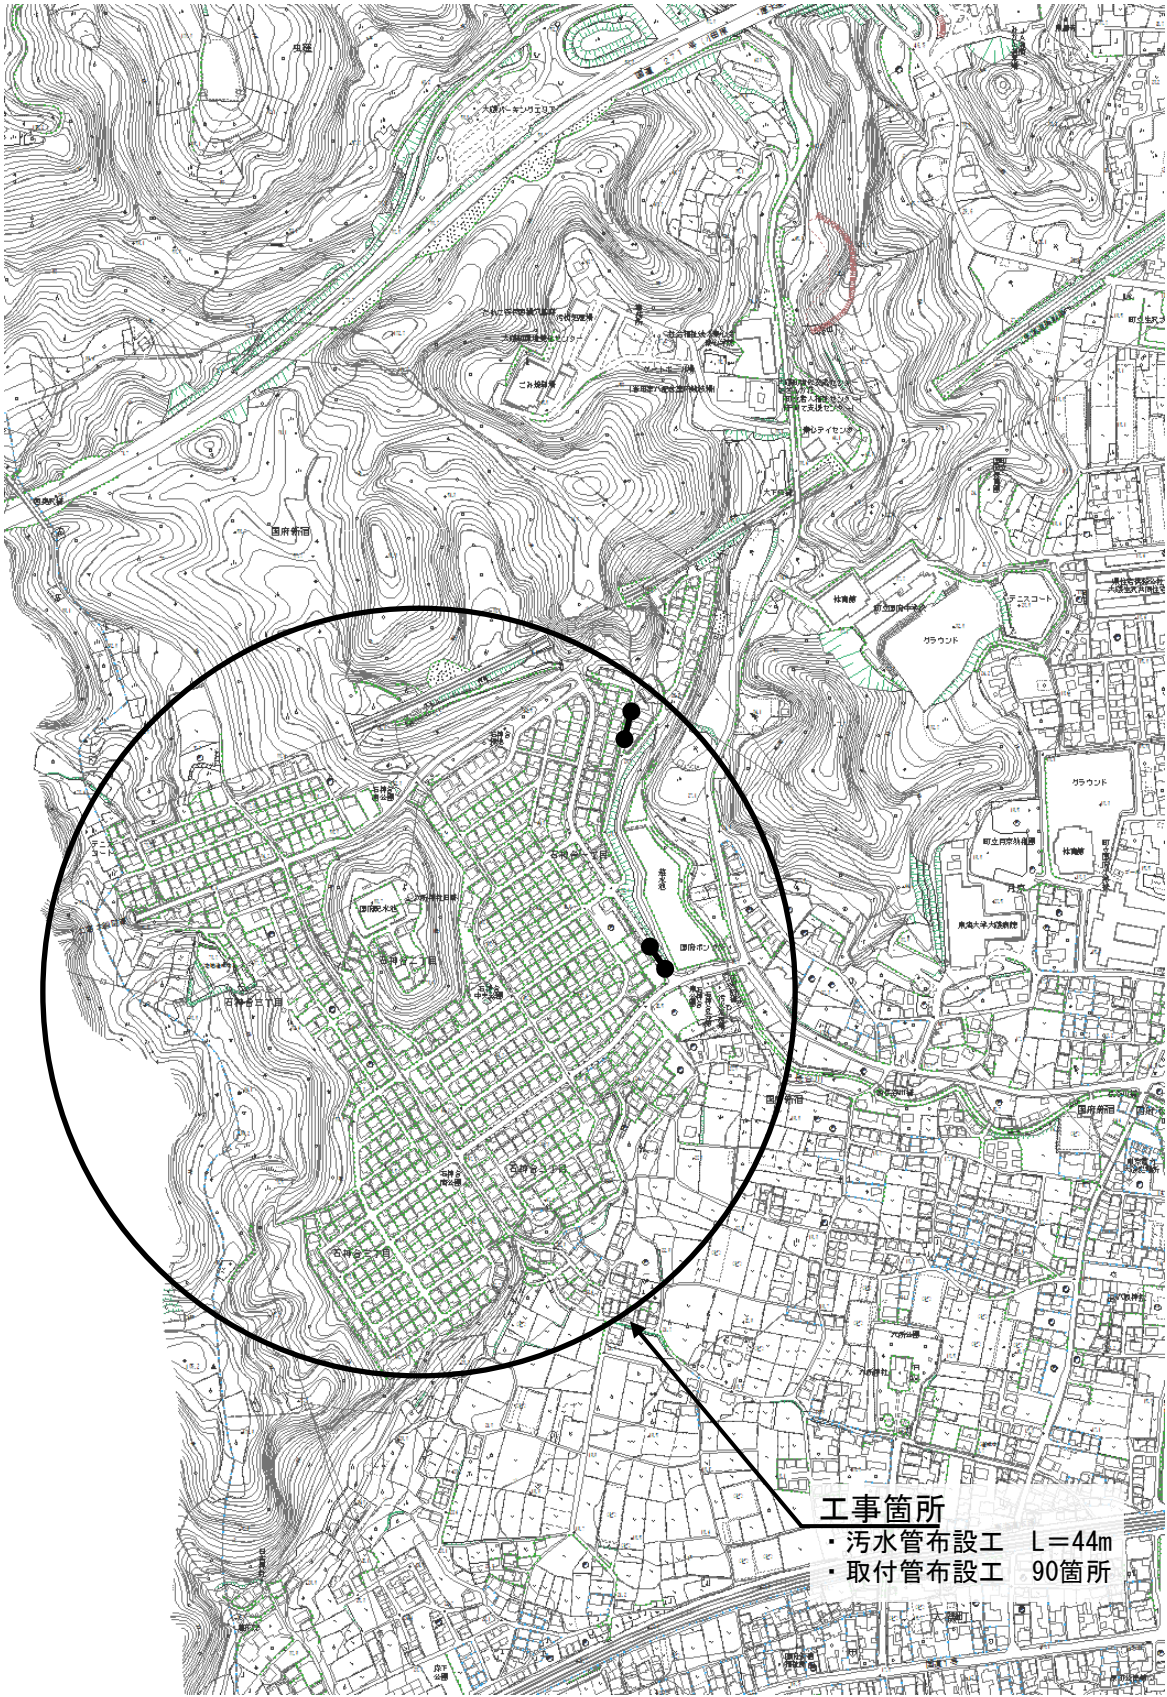

件名	石神台地区污水管修繕工事（その2）
工事場所	大磯町 石神台 地内
