



**大磯町総合計画後期基本計画
＋
大磯町人口ビジョン・総合戦略
実施計画進行管理書**

【平成29年度】

目 次

1. 実施計画進行状況(平成29年度)	1
2. 実施計画進捗状況表		
進捗状況表の見方	2
柱1 「安全で安心なあたたかみのあるまちづくり」	3
柱2 「町民の力や知恵が集まるまちづくり」	5
柱3 「人と自然が共生する循環のまちづくり」	6
柱4 「心豊かな人を育てるまちづくり」	8
柱5 「個性と魅力と活力のあるまちづくり」	10
3. 数値目標達成状況(平成28～32年度)	15

1. 実施計画進行状況(平成29年度)

実施計画事業は毎年進行状況の管理を行います。ここでは、平成29年度事業の進行状況について記載します。

計画事業の進行状況一覧表(平成29年度)

柱	項目	進行状況			事業数
		A	B	C	
柱1	安全で安心なあたたかみのあるまちづくり	4	1	0	5
柱2	町民の力や知恵が集まるまちづくり	1	0	0	1
柱3	人と自然が共生する循環のまちづくり	3	2	0	5
柱4	心豊かな人を育てるまちづくり	4	1	0	5
柱5	個性と魅力と活力のあるまちづくり	12	3	0	15
計		24	7	0	31
		77.4%	22.6%	0.0%	

※ 進行状況の説明

- A 概ね計画どおり実施 …… 概ね年度別事業概要のとおり実施された事業
- B 計画を変更 …… 事業見直しや繰越等により事業内容や実施時期等を変更した事業
- C 事業の中止・休止 …… 事業見直し等により中止もしくは休止された事業

進行管理対象事業(平成29年度:31事業)


[戦略欄に○のある事業は総合計画後期基本計画重点プロジェクト(=人口ビジョン・総合戦略)に合致する事業]

[計画欄に○のある事業は計画等策定事業]

第1章 安全で安心なあたたかみのあるまちづくり 5事業				第4章 心豊かな人を育てるまちづくり 5事業			
認定番号	事業名	戦略	計画	認定番号	事業名	戦略	計画
1-2	消防車両更新事業(常備)	○		4-1	国府幼稚園統合(私立認定こども園誘致)事業	○	
1-9	(仮称)東部子育て支援センター整備事業	○		4-3	大磯小学校施設整備事業(老朽化改善整備)		
1-6	福祉センター改修事業			4-4	大磯中学校施設整備事業(老朽化改善整備)		
1-10	障がい者福祉計画策定事業		○	4-8	学校職員校務用コンピュータ整備事業	○	
1-7	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定等事業		○	4-5	学校図書館連携システム整備事業	○	
第2章 町民の力や知恵が集まるまちづくり 1事業				第5章 個性と魅力と活力のあるまちづくり 15事業			
認定番号	事業名	戦略	計画	認定番号	事業名	戦略	計画
2-1	茶屋町公民館整備事業	○		5-1	都市計画決定事業		
第3章 人と自然が共生する循環のまちづくり 5事業				5-20	大磯駅周辺安全安心・にぎわい創出事業	○	
認定番号	事業名	戦略	計画	5-2	旧東海道松並木(大磯高麗1号線)整備事業	○	
3-1	公園トイレ整備事業	○		5-4	橋りょう長寿命化修繕事業		
3-3	準用河川血洗川改修事業			5-7	幹線21号線整備事業		
3-4	公共下水道整備事業	○		5-8	国府本郷西小磯1号線整備事業		
3-5	公共下水道維持管理事業	○		5-9	幹線17号線整備事業		
3-6	(仮称)リサイクルセンター整備事業	○		5-21	生沢月京1号線整備事業		
				5-10	道路ストック定期点検事業		
				5-12	交通空白地域解消事業	○	
				5-13	農業用水路整備事業		
				5-14	(仮称)農業振興基本計画等策定事業		○
				5-15	大磯港みなのオアシス推進事業	○	
				5-16	(仮称)西久保休憩施設整備事業	○	
				5-17	新たな観光の核づくり事業	○	

2. 実施計画進捗状況表

進捗状況表の見方

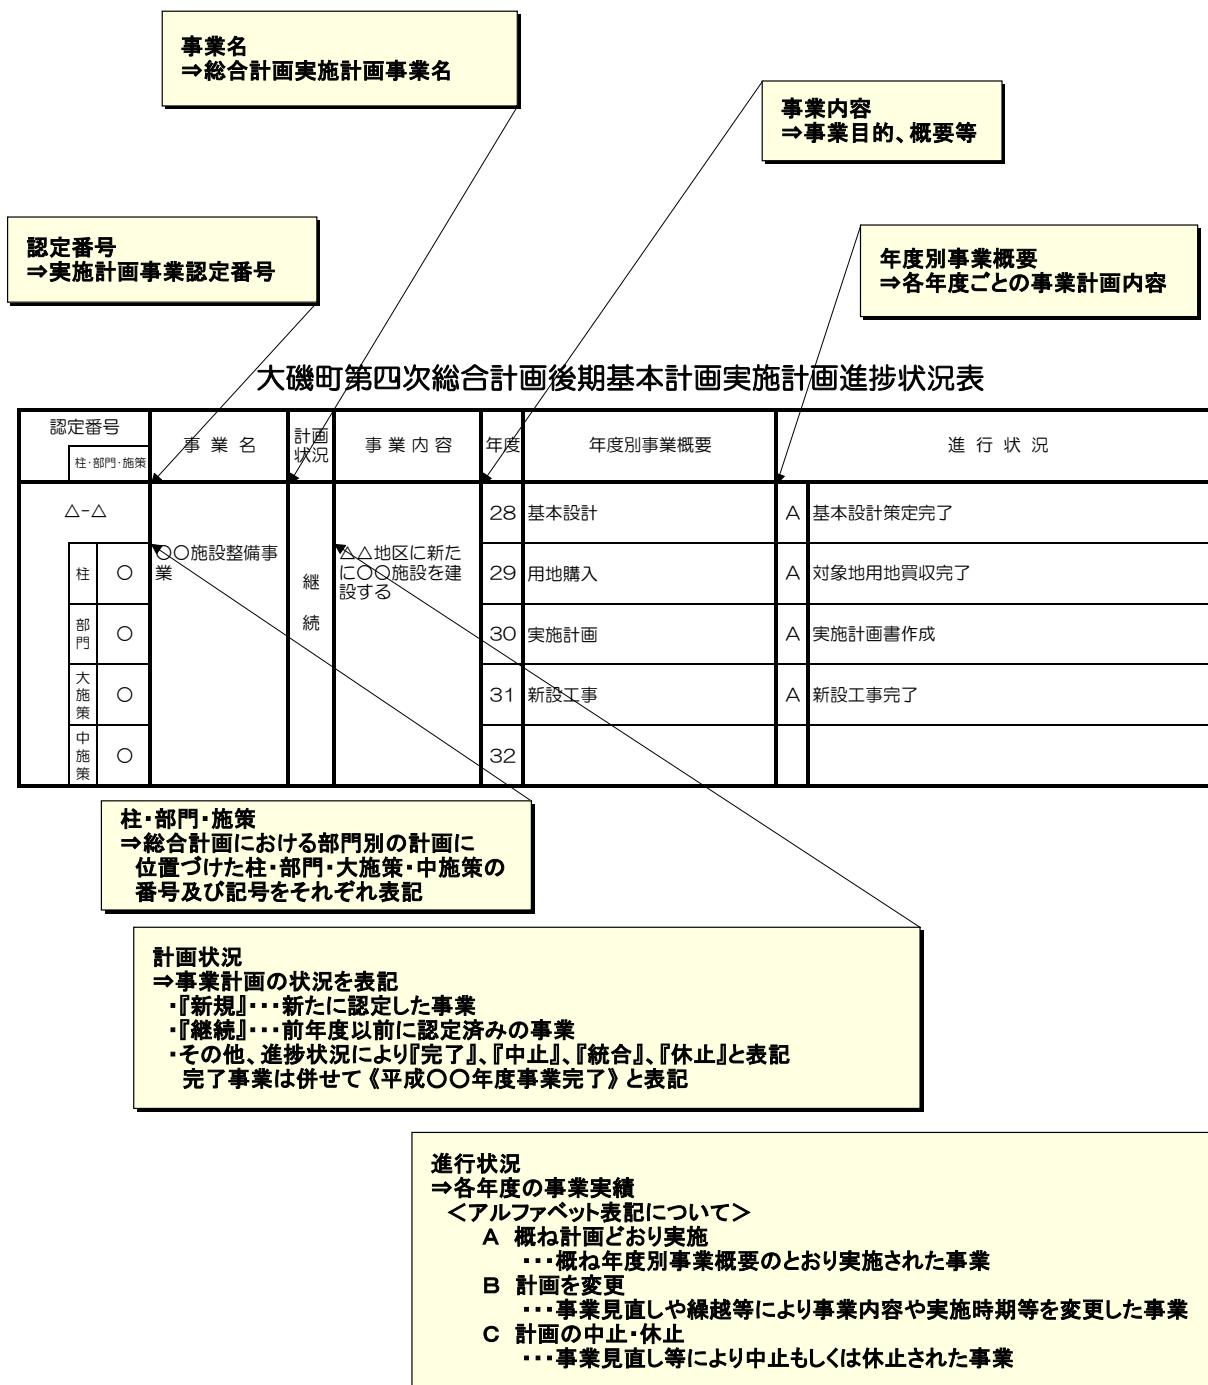

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況	
柱	部門・施策							
1-1		消防指令センター共同整備事業	完了	1市2町（平塚市、大磯町、二宮町）による消防指令センターの共同整備を行う。	28	共同整備費負担金	A 平成29年度の共同指令センター運用開始に向け、1市2町（平塚市、大磯町、二宮町）で設備の整備を行った。	
	柱				1	29		
	部門				2	30		
	大施策				A	31		
	中施策				1	32		
《平成28年度事業完了》								
1-2		消防車両更新事業（常備）	継続	消防車両の老朽化・経年劣化が著しいため、消防活動・災害活動・救急活動に支障をきたさないよう、消防車両の計画的な更新を図る。	28			
	柱				1	29	消防ポンプ自動車購入	A 消防ポンプ自動車の更新が完了した。
	部門				2	30	高規格救急自動車購入	
	大施策				A	31	防災資機材運搬車購入	
	中施策				3	32		
1-3		消防団車両更新事業	完了	消防団2個分団車両（消防ポンプ自動車）の経年劣化が著しく災害活動に支障をきたしているため更新を図る。	28	小型動力ポンプ付積載車購入（第1・5分団）	A 消防団2個分団（第1分団、第5分団）の車両更新を実施した。	
	柱				1	29		
	部門				2	30		
	大施策				A	31		
	中施策				3	32		
《平成28年度事業完了》								
1-4		駅前自転車駐車場解体事業	完了	大磯町営駅前自転車駐車場の供用開始に伴い、用途廃止となる大磯町営駅前東自転車駐車場を解体する。	28	解体工事、監理委託	A 大磯駅前東自転車駐車場の解体工事を実施した。	
	柱				1	29		
	部門				3	30		
	大施策				B	31		
	中施策				2	32		
《平成28年度事業完了》								
1-9		(仮称)東部子育て支援センター整備事業	新規	東部地区に子育て支援センター（つといの広場）を増設するため、新たに施設整備を行う。	28			
	柱				1	29	実施設計委託等	B 既存施設の改修により整備する計画であったが、老朽化等の状況を鑑み、新築により整備することとし、敷地境界画定測量及び既存建物解体工事を実施した。
	部門				4	30	実施設計委託、建築工事等	
	大施策				A	31	建築工事等	
	中施策				2	32		

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況
柱	部門・施策						
1-5		スポーツ健康増進計画策定事業	完了	町の健康づくりに関する新たな計画、「スポーツ健康増進計画」を策定する。	28	計画策定業務委託	A 「健康増進計画」、「スポーツ推進計画」、「食育推進計画」の現行3計画を統合し、「けんこうプラン大磯」を策定した。
柱	1				29		
部門	6				30		
大施策	A				31		
中施策	1				32		
《平成28年度事業完了》							
1-6		福祉センター改修事業	完了	経年劣化した空調設備の改修を行い、利用者に快適な利用環境を提供する。	28	空調設備改修工事、監理委託、実施設計	B 空調設備改修の実施設計を行い、改修工事の実施を平成29年度に変更した。
柱	1				29	空調設備改修工事、監理委託	A 空調設備の改修工事が完了した。
部門	8				30		
大施策	A				31		
中施策	2				32		
《平成29年度事業完了》							
1-10		障がい者福祉計画策定事業	新規完了	障がい福祉計画の計画期間終了に伴う次期計画の策定とともに、策定が義務付けられた障害児福祉計画の策定を行う。	28		
柱	1				29	計画策定業務委託	A 市町村障害福祉計画として「第5期障がい福祉計画」、市町村障害児福祉計画として「第1期障がい児福祉計画」を策定した。
部門	9				30		
大施策	A				31		
中施策	3				32		
《平成29年度事業完了》							
1-7		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定等事業	完了	「第七期大磯町高齢者福祉計画（介護保険事業計画）」を策定する。	28	アンケート調査（基礎調査）実施	A 計画策定の基礎資料となるアンケート調査を実施し、実態把握を行った。
柱	1				29	計画策定業務委託（第七期）	A 「第七期大磯町高齢者福祉計画（介護保険事業計画）」を策定した。
部門	10				30		
大施策	A				31		
中施策	1				32		
《平成29年度事業完了》							
1-8		地域密着型サービス介護施設等整備事業	完了	地域医療介護総合確保基金を活用し、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所の併設施設の建設、開設に対し補助を行う。	28	施設等整備事業者への助成	A 第六期高齢者福祉計画（介護保険事業計画）で見込まれるサービス量を確保するため、公募により選定したりんどうグループホーム及びりんどうケアウィレッジの整備に対し、補助を行った。
柱	1				29		
部門	10				30		
大施策	A				31		
中施策	1				32		
《平成28年度事業完了》							

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況	
柱・部門・施策								
2-1	柱 2 部門 1 大 施 策 B 中 施 策 1	茶屋町公民館整備事業	継 続	地域の活動拠点となる地域会館を整備するため、茶屋町公民館を建て替える。	28	建物規模や内容の検討等	A	建設の規模や内容の検討、補助金等財源調査を行った。
					29	基本設計、実施設計委託等	A	基本設計及び実施設計委託を実施し、狭あい道路申請手続きを行った。
					30	建設工事等		
					31			
					32			
2-2	柱 2 部門 3 大 施 策 A 中 施 策 1	公共施設等総合管理計画策定事業	完 了	公共施設等の総合かつ計画的な管理に関する基本方針等を定めた公共施設等総合管理計画を策定する。	28	計画策定業務委託	A	公共施設等総合管理計画を策定した。
					29			
					30			
					31			
					32			
		《平成28年度事業完了》						
2-3	柱 2 部門 3 大 施 策 A 中 施 策 1	本庁舎施設整備事業	完 了	本庁舎の耐震補強を担う鉄骨プレースの塗装が劣化し、腐食が進行しつつあるため再塗装により保全を行う。	28	耐震補強鉄骨プレース塗装工事	A	耐震補強鉄骨プレース塗装工事を実施した。
					29			
					30			
					31			
					32			
		《平成28年度事業完了》						

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況	
柱	部門・施策							
3-1	柱 3	公園トイレ整備事業	完了	町内の街区公園を快適で安心して利用できるよう、既存設備の改修を行う。	28	改修工事（なかまる公園・化粧坂公園）	A	なかまる公園既設トイレの撤去及び新築（男女兼用）、化粧坂公園既設トイレの改修を実施した。
					29	改修工事（池田公園）	A	池田公園の衛生器具、照明、コンセント類、トイレブースの交換、内外装塗装、屋上の防水改修を実施した。
					30			
					31			
					32			
		《平成29年度事業完了》						
3-2	柱 3	運動公園長寿命化対策事業	継続	大磯運動公園施設長寿命化計画に基づき施設の改修工事を実施する。	28	改修工事等（噴水広場、ウッドデッキ等）	A	既設転落防止柵の撤去及びコンクリート壁の新設、既設噴水広場洗い出し舗装の撤去及び保水タイルの新設、既設ウッドデッキの撤去及びウッドデッキの新設を実施した。
					29	《H29年度事業休止》		事業内容の見直しを必要とするため事業休止
					30	管理事務所等防水層補修工事		
					31			
					32			
3-3	柱 3	準用河川血洗川改修事業	継続	準用河川血洗川の護岸の改修を行う。	28	補償調査業務委託、用地取得	A	用地取得及び用地取得に伴う補償が完了した。
					29	護岸改修工事	A	護岸改修工事を実施した。（L=47m 護岸工）
					30			
					31	護岸改修工事		
					32			
3-4	柱 3	公共下水道整備事業	継続	公共水域の水質改善及び雨水浸水対策を図るため、第4期事業認可に基づき整備推進を図る。	28	整備工事、実施設計委託等	B	国庫補助金（社会資本整備総合交付金）が、要望額（320,000千円）より削減（内示額207,700千円）となったため、汚水枝管整備の進捗が一部図れなかった。
					29	整備工事、実施設計委託等	B	国庫補助金（社会資本整備総合交付金）が、要望額（306,180千円）より削減（内示額238,000千円）となったため、汚水枝管整備の進捗が一部図れなかった。
					30	整備工事、実施設計委託等		
					31	整備工事、実施設計委託等		
					32	整備工事、実施設計委託等		
3-5	柱 3	公共下水道維持管理事業	継続	公共下水道施設の老朽化に伴う修繕及び改築工事を行う。	28	汚水管修繕工事	A	石神台地区下水管の修繕工事を実施した。
					29	汚水管修繕工事、雨水浸入水箇所修繕工事	B	石神台地区下水管の修繕工事を実施したが、各地権者との工事日程調整等に日数を要したことにより、一部が事故繰越となった。
					30	汚水管修繕工事、雨水浸入水箇所修繕工事等		
					31	雨水浸入水箇所修繕工事、雨天時増水対策工事等		
					32	雨水浸入水箇所修繕工事		

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況	
柱・部門・施策								
3-6		(仮称)リサイクルセンター整備事業	完了	平塚・大磯・二宮ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、リサイクルセンターを整備し、1市2町での相互利用を図る。	28	設計、施工監理、整備工事等	A	公募型プロポーザル方式により決定した事業者からの提案を基本設計で具現化、実施設計で施工の詳細を整理するなどの協議を行い、建築確認等の諸手続きを経て建設工事に着手した。
柱	3				29	整備工事	A	実施設計に基づき整備を行い、リサイクルセンターが完成した。(平成30年4月稼働)
部門	6				30			
大施策	A				31			
中施策	3				32			
		《平成29年度事業完了》						

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況
柱	部門・施策						
4-1	柱 4 部門 1 大施策 A 中施策 2	国府幼稚園統廃合（私立認定こども園誘致）事業	継続	国府幼稚園とたかとり幼稚園を統廃合し、国府幼稚園の場所に新たに公私連携幼保連携型の私立の認定こども園を誘致して開園する。	28	設置運営事業者選定・決定等	A 設置運営事業者を公募型プロポーザル方式により選定し、決定した。
					29	施設整備に対する補助（事業者による新施設建設・既存施設解体・撤去等）	A 公私連携法人による新施設整備の完了に伴い、施設整備に対する補助を実施した。
					30	施設整備に対する補助（事業者による既存施設解体・撤去等）	
					31		
					32		
4-2	柱 4 部門 2 大施策 B 中施策 1	国府小学校施設整備事業	完了	国府小学校校舎の陸屋根部分の屋上防水改修を行う。	28	校舎屋根改修実施設計委託、改修工事	A 国府小学校校舎屋上の陸屋根部分の防水改修工事を実施した。
					29		
					30		
					31		
					32		
《平成28年度事業完了》							
4-3	柱 4 部門 2 大施策 B 中施策 1	大磯小学校施設整備事業（老朽化改善整備）	移行	老朽化している大磯小学校の音楽室のエアコンを改修し、快適な教室環境を提供する。	28		
					29	音楽室エアコン改修工事設計	A 校舎1階の音楽室等の空調設備及び配線・配管等の関連設備の基本実施設計委託を行った。
					30	《 新規事業へ移行 》	4-10「学校施設・整備維持事業（小中学校普通教室等空調整備）」へ移行
					31		
					32		
《平成30年度新規事業へ移行》							
4-4	柱 4 部門 2 大施策 B 中施策 1	大磯中学校施設整備事業（老朽化改善整備）	継続	大磯中学校の老朽化した校舎3号館の改修を行い、生徒の安全を図るとともに学習環境の改善を進める。	28		
					29	大規模改修調査・基本設計委託	A 校舎3号館の大規模改修に向けた調査を実施し、基本設計が完了した。
					30		
					31	3号館大規模改修工事実施設計委託	
					32	3号館大規模改修工事（Ⅰ期）	

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況	
柱	部門・施策							
4-8	柱 4	学校職員校務用コンピュータ整備事業	新規・完了	町立小・中学校職員の校務用PC及びプリンタ等の借上げ及びネットワークの構築を行う。	28			
					29	校務用パソコン導入、ネットワーク整備	A	新規リース契約の締結及びネットワークの構築を行い、新しい校務用パソコンを各校に導入した。
					30			
					31			
					32			
		《平成29年度事業完了》						
4-5	柱 4	学校図書館連携システム整備事業	継続	図書館のコンピュータシステムに学校図書館連携システム機能を付加し、図書館及び学校図書館の資料データベースを統合管理し、相互貸借を可能にする。	28	図書資料のデータ化、貸出・返却業務電算化等	A	学校図書館・図書資料のデータ化を完了し、貸出・返却業務の電算化を開始した。
					29	連携システム検討、蔵書管理用パソコン借上	B	連携システムの更なる検討が必要であるため、機器の新規リースのみ実施した。
					30	連携システム検討、蔵書管理用パソコン借上		
					31	連携システム検討、蔵書管理用パソコン借上		
					32	連携システム借上、図書データ移行等		
4-6	柱 4	郷土資料館リニューアル事業	完了	旧吉田茂邸再建事業と足並みを揃え、郷土資料館の資料整備とともに展示リニューアルを実施する。	28	整備工事、監理委託、資料整備委託等	A	展示リニューアル工事を実施し、資料整備及び施設改修を図り、平成28年11月3日にリニューアルオープンした。
					29			
					30			
					31			
					32			
		《平成28年度事業完了》						
4-7	柱 4	郷土資料館施設整備事業	完了	施設の不良箇所等を整備して、安全で快適な環境づくりを進める。	28	監理委託、整備工事（中庭）	A	中庭整備工事を実施し、平成28年11月3日にリニューアルオープンした。
					29			
					30			
					31			
					32			
		《平成28年度事業完了》						

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進捗状況		
柱	部門・施策								
5-1	都市計画決定事業	継続	まちづくり基本計画に則した土地利用を推進し、良好な住宅・住環境の形成を図るため、都市計画法による地域地区の見直しや地区計画制度の活用を図る。	28	都市計画基本図修正等業務委託	B	既製の行政境界の位置に誤謬があることが発覚し、過去の行政境界確定資料の確認、既製図データの修正作業に不測の日数を要したため繰越となった。		
				柱	5	29	都市計画基礎調査業務委託	A	町の現況を把握し、都市計画を見直す基礎資料となり、都市計画法に基づく調査の基礎資料とするための都市計画基礎調査業務委託を実施した。
				部門	1	30	都市計画基礎調査業務委託		
				大施策	A	31	測量調査業務委託		
				中施策	1	32	都市計画公園（高麗山公園）変更業務委託		
5-20	大磯駅周辺安全安心・にぎわい創出事業	新規	大磯駅前広場に安全、安心な歩行者空間、にぎわい環境を創出するとともに、車両動線等も検討する。もって、大磯駅前広場を含めた周辺の拠点整備の計画を策定する。	28					
				柱	5	29	計画策定業務委託等	A	既往計画、諸要望の方針、求められる機能を取りまとめ、調査及び基盤整備等に必要の計画案を策定した。
				部門	2	30	計画案の協議		
				大施策	A	31	交通シミュレーション調査・社会実験、駅前広場整備実施設計		
				中施策	1	32			
5-2	旧東海道松並木（大磯高麗1号線）整備事業	継続	旧東海道松並木（大磯高麗1号線）の整備、維持管理を行う。	28	修繕工事	A	松並木敷の樹木剪定・除草及び雨水対策工事を実施した。（L=36.5m 舗装工、排水構造物工）		
				柱	5	29	基本設計、費用対効果検証業務	B	基礎設計業務委託を実施した。費用対効果検証業務について調査手法を検討し、アンケート調査票を作成した。対象者の追加と交付金要綱の変更に伴い、調査票の発送、集計を平成30年度に行うこととした。
				部門	3	30	計画策定調整		
				大施策	B	31	詳細設計		
				中施策	2	32	整備工事		
5-3	旧吉田茂邸再建事業	完了	大磯町の歴史において重要な施設であった旧吉田茂邸を再建し、多くの人々が訪れ利用できる施設とするとともに、日本の近代政治に触れ、学ぶことのできる施設として整備する。	28	施設オープンに向けた準備作業等	A	再建工事を完了し、平成28年6月24日に神奈川県から引渡しを受けた。また、調度品作製等の準備を行い、平成29年4月1日に一般公開した。		
				柱	5	29			
				部門	3	30			
				大施策	B	31			
				中施策	2	32			
《平成28年度事業完了》									
5-4	橋りょう長寿命化修繕事業	継続	橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、計画的かつ安全な橋りょうの管理を図る。	28	設計業務委託	A	東小磯跨線橋3期分、下堰橋の設計委託を実施した。また、縦越明許の東小磯跨線橋2期分のJR受託協定による調査設計・耐震設計を実施した。		
				柱	5	29	修繕工事、設計業務委託	A	東小磯跨線橋3期分の工事を実施した。また、西奥沢橋の設計委託を実施した。
				部門	4	30	修繕工事、設計業務委託		
				大施策	A	31	修繕工事、設計業務委託		
				中施策	2	32	修繕工事、設計業務委託		

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況
柱・部門・施策							
5-5		大磯67号線整備事業	完了	道路排水工事の整備完了に伴い、舗装の本復旧を行う。	28	舗装整備工事	A 舗装の本復旧工事を実施した。(L=110m 舗装工、道路土工、区画線工)
柱	5				29		
部門	4				30		
大施策	A				31		
中施策	2				32		
		《平成28年度事業完了》					
5-6		国府本郷16号線整備事業	完了	舗装の痛みが著しく通行に支障を及ぼしているため、舗装の打替えを行う。	28	舗装整備工事	A 舗装の打替え工事を実施した。(L=78m 舗装工、土工、縁石工)
柱	5				29		
部門	4				30		
大施策	A				31		
中施策	2				32		
		《平成28年度事業完了》					
5-7		幹線21号線整備事業	継続	二級河川不動川改修事業に伴い、国府橋の架替えを行うと同時に幹線21号線の未買収地の拡幅整備を行う。	28	不動産鑑定評価	B 用地交渉が整わず、不動産鑑定評価を実施できなかった。
柱	5				29	用地買収	A 用地買収及び物件除却補償契約締結が完了した。
部門	4				30		
大施策	A				31	拡幅整備工事等	
中施策	2				32	拡幅整備工事等	
5-8		国府本郷西小磯1号線整備事業	継続	大磯運動公園北口や万台こゆるぎの森への主要なアクセス道路として、また、将来的には広域連絡路線として計画的に道路整備を推進する。	28	拡幅整備工事、測量調査委託、用地買収等	B 用地買収のできた土地から整備を進めたが、一部の区間が事故線越となった。
柱	5				29	拡幅整備工事等	A 昨年度からの事故線越分を含め、拡幅整備工事を実施した。(L=144m 道路土工、縁石工、排水構造物工)
部門	4				30	拡幅整備工事等	
大施策	A				31	拡幅整備工事等	
中施策	2				32		
5-9		幹線17号線整備事業	継続	平塚市と接し、大磯町中央部を南北に通過する交通量の多い幹線道路として、計画的に道路整備を推進し、円滑で安全安心な道路の整備を図る。	28	詳細設計業務委託	A 詳細設計を実施した。(L=1,030m 現況路面補修設計、路線検討設計)
柱	5				29	舗装整備工事	A 舗装整備工事を実施した。(L=520m、舗装工、道路工)
部門	4				30	整備工事	
大施策	A				31		
中施策	2				32		

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況	
柱	部門・施策							
5-21	柱 5	生沢月京1号線整備事業	新規	県が実施している二級河川不動川改修事業に伴い道路拡幅を行う。	28			
					29	用地買収等	A	用地買収及び物件除却補償契約締結が完了した。
					30			
					31	拡幅整備工事		
					32			
5-22	柱 5	国府本郷月京1号線整備事業	新規	県が実施している二級河川不動川改修事業に伴い道路拡幅を行う。	28			
					29			
					30			
					31	用地買収		
					32			
5-10	柱 5	道路ストック定期点検事業	継続	道路構造物について、5年毎に点検するとともに、修繕計画を策定し計画的かつ安全な道路施設の管理を図る。	28	定期点検業務委託	A	舗装(88.6km)及び道路照明灯(69灯)の点検業務を実施した。
					29	定期点検業務委託	A	舗装(0.094km)及び橋梁(12橋)、路面下空洞調査(8.375km)
					30	道路施設修繕計画策定業務委託		
					31	修繕工事		
					32	定期点検業務委託		
5-11	柱 5	西小磯14号線整備事業	完了	狭あい道路整備事業で用地取得した箇所の道路整備を行う。	28	拡幅整備工事	A	拡幅整備工事を完了した。(L=60.7m 舗装工、土工、排水施設工)
					29			
					30			
					31			
					32			
《平成28年度事業完了》								
5-12	柱 5	交通空白地域解消事業	完了	町民と協働し地域のニーズに応じた新たな公共交通の検討及び導入又は見直しを図る。	28	乗合タクシー実証運行事業委託	A	西小磯東区の一部の地区に対して、乗合タクシーの実証運行を開始した。
					29	乗合タクシー運行事業委託	A	西小磯東区の一部の地区に対して、乗合タクシーの本格運行を開始した。
					30			
					31			
					32			
《平成29年度事業完了》								

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進捗状況	
柱	部門・施策							
5-13	柱 5 部門 5 大施策 B 中施策 1	農業用水路整備事業	継続	老朽化が著しい農業用水路の改修を行う。	28	測量・地質調査、実施設計、改修工事	A	西小磯地区排水路の測量・地質調査・実施設計等及び改修工事を実施し、老朽化と腐食が激しい区間の中間部分を優先的に施工した。(L=166m 組立柵渠設置工)
					29	西小磯排水路改修工事等	A	西小磯地区排水路の改修工事を実施した。(L=259m 組立柵渠設置工)
					30	西小磯排水路改修工事等		
					31	西小磯排水路改修工事等		
					32			
5-14	柱 5 部門 5 大施策 C 中施策 1	(仮称) 農業振興基本計画等策定事業	完了	農地の有効活用の推進を図るための整備計画の策定を行う。	28	基礎調査実施	A	基礎調査を実施した。
					29	農業振興地域整備計画策定等	B	農業振興地域整備計画の見直しに伴う県との協議に日数を要し、策定は翌年度に明許繰越となった。
					30	<< H29年度事業完了 >>	-	予算は伴わずに、H30年度まで事業継続
					31			
					32			
《平成29年度事業完了》								
5-15	柱 5 部門 8 大施策 A 中施策 1	大磯港みなとオアシス推進事業	継続	大磯港への来訪者へ魅力となる情報を提供し、町の交流拠点となる施設の整備を行い、地域活性化を促進する。また、漁業を中心とした第1次産業の活性化による6次産業化を推進する。	28	基本構想策定業務委託	A	大磯港みなとオアシス(賑わい交流施設)整備計画基本構想を策定し、今後の大磯港みなとオアシス登録に向けた整備方針や整備スケジュールを検討した。
					29	アドバイザー業務委託	B	「大磯港賑わい創出施設の設置、管理等に関する条例」を制定し、指定管理者の募集まで実施したが、選定に係る業務は明許繰越となった。
					30	賑わい交流施設基本実施設計・整備工事		
					31	賑わい交流施設整備工事、みなとオアシス案内標識整備工事		
					32			
5-16	柱 5 部門 8 大施策 A 中施策 3	(仮称) 西久保休憩施設整備事業	継続	「大磯丘陵(グリーンパーク)」エリアの散策路における西久保バス停付近にトイレ設備を兼ね備えた休憩施設を整備し、町民の方たちや来町者の散策・周遊環境の改善を図る。	28	利用状況調査(仮設トイレ設置)	A	仮設トイレを春・秋それぞれ2か月間設置し、利用状況を把握した。
					29	測量調査・設計委託	A	測量(境界確定)及び設計を行い、建築工事に必要な図面等を整備した。
					30			
					31	監理委託、整備工事		
					32			
5-17	柱 5 部門 8 大施策 A 中施策 3	新たな観光の核づくり事業	完了	町内の周遊環境整備のため、大磯迎賓館にデザイン看板を設置する。また、町民の地域に対する愛着・誇りを醸成するとともに大磯の魅力を町内外に広く発信・浸透させるための冊子を発行する。	28	看板作成、大磯ブランドチラシ・フリーペーパー作成	A	大磯迎賓館に町民デザインによるロートアイロン看板を設置した。大磯ブランドチラシを作成し、ブランドメッセージを募集・決定するとともに、フリーペーパー「大磯暮らし」を発行した。
					29	大磯ブランド絵本・フリーペーパー作成	A	大磯町の魅力をまとめた「私たちがつくりたい暮らしのえほん」、町民のライフスタイルを紹介するフリーペーパー「大磯暮らし VOL. 02」を発行した。
					30			
					31			
					32			
《平成29年度事業完了》								

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況		
柱・部門・施策									
5-18		鳴立庵整備事業	完了	施設の魅力の向上と来場者の増加を図るとともに、町内周遊環境の向上を図るため、鳴立庵の入り口周辺の環境整備を行う。	28	整備工事（転落防止柵、植栽帯）	A	転落防止柵及び植栽帯の整備、蛙のオブジェ及び言葉のオブジェの設置を行った。	
柱	5				29				
部門	8				30				
大施策	A				31				
中施策	3				32				
		《平成28年度事業完了》							
5-19		国府本郷23号線整備事業	完了	今後整備予定の大磯港賑わい交流施設と旧吉田茂邸を自転車で回遊するためのルートの一部として整備する。	28	舗装整備工事、自転車ライン設置	A	舗装整備及び自転車ライン設置工事を実施した。（L=230m 舗装工、区画線工）	
柱	5				29				
部門	8				30				
大施策	A				31				
中施策	3				32				
		《平成28年度事業完了》							
5-23		観光サイン・観光マップ整備事業	新規	散策・周遊環境を整えるため、町内の観光サイン及び観光マップのリニューアルを行う。	28				
柱	5				29				
部門	8				30	観光サイン整備			
大施策	A				31	観光サイン整備			
中施策	3				32				

3. 数値目標達成状況（平成28～32年度）

【平成30年6月1日現在】

重点プロジェクト＝総合戦略事業

「花」プロジェクト 観光による魅力づくり
＝総合戦略1 大磯への新しいひとの流れをつくる

	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
数値目標	入込観光客数	万人	85.8 (H26)	86.0	91.7				100 以上

	事業	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
総合戦略 KPI	1	民間団体による観光関連事業数	回	30 (H27)	39	45				45 以上
	1	町有観光施設来場者数	人	39,828 (H27)	48,721	56,731				48,000 以上
	2	大磯港県営駐車場利用台数	台	73,863 (H27)	87,285	97,300				81,000 以上
	3	ポートハウスてるがさき利用者数	人	18,566 (H27)	26,395	31,785				20,000 以上

「鳥」プロジェクト 笑顔の子育てまちづくり
＝総合戦略2 大磯で若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
数値目標	0歳～14歳の人口割合	%	12.2 (H26)	11.3	11.3				12.2 以上

	事業	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
総合戦略 KPI	1	出生数	人	169 (H26)	186	201				200 以上
	1	子育て世帯のずっと・当分 住み続けたい意向	%	69.3 (H26)	次回調査予定は、 H30頃総計アンケート					75.0 以上
	2	待機児童数	人	18 (H27)	18	18				0
	2	子育て支援センター利用者 数	人	14,330 (H26)	17,162	15,670				18,500
	3	学童保育登録者数	人	151 (H26)	188	205				183
	3	放課後子ども教室登録者数	人	450 (H26)	466	504				500
	4	各学校の教育用コンピュー タ数	台	40 (H27)	40	40				80 以上
	4	英語指導助手数	人	2 (H27)	2	2				3

「風」プロジェクト 交流によるしごとづくり

=総合戦略3 大磯にしごとをつくり安心して働けるようにする

	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
数値目標	昼夜間人口比率	%	77.4 (H22)	79.1 (H27)	次回調査予定は、 H32国勢調査				80.0 以上

事業	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
総合戦略 K P I	1 町内事業所数	か所	1,192 (H27)	1,139	1,066				1,250 以上
	2 空き家利活用実績の件数	件	0 (H27)	0	2				5 以上
	2 認定農業者数	人	27 (H27)	26	17				30 以上
	2 年間新規就農者数	件	2 (H27)	2	5				4 以上
	2 新規就漁者数	人	0 (H27)	0	0				3 以上
	3 町民一人1日当たりのごみ排出量	g	895 (H26)	959	集計中				882 以下
	3 スマートエネルギー設備補助件数累計	件	23 (H26)	52	64				170 以上

「輪」プロジェクト 多世代による地域づくり

=総合戦略4 大磯の地域が連携しあい安全・安心な暮らしをつくる

	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
数値目標	住み続けたい人の割合	%	81.8 (H26)	次回調査予定は、 H30頃総計アンケート					88.0 以上

事業	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
総合戦略 K P I	1 町民活動団体数	団体	22 (H27)	23	24				30 以上
	1 町民活動推進補助金申請数	件	6 (H27)	5	7				10 以上
	2 ロコモティブシンドロームの予防行動実施率(60~75歳)	%	25.2 (H26)	37.8	次回調査予定は、 H33健康づくりアンケート				50.0 以上
	3 消防団員充足率	%	96.0 (H27)	95.0	96.7				100
	3 防災訓練参加率	%	57.0 (H27)	67.0	88.3				80.0 以上
	4 交通空白地域の解消(か所数)	か所	0 (H27)	1	1				2
	4 町内8河川の平均BOD値	mg/l	3.8 (H26)	3.6	3.5				3.2 以下

柱1 安全で安心なあたたかみのあるまちづくり

安全なまちづくりの推進

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
1 危機管理	A 1	防災情報メール登録者数	件	2,816 (H27)	1,737	2,093				3,000 以上
	A 2	自主防災組織数	団体	22 (H27)	23	25				26
	A 3	防災訓練（安否確認訓練）参加率	%	57.0 (H27)	67.0	88.3				80.0 以上
	A 4	備蓄食糧品の計画数に対する確保率	%	122 (H27)	134	139				100 以上
	B 1	防災ラジオ利用世帯数	件	0 (H27)	0	0				5,000 以上
2 消防・救急・救助	A 1	消防団員充足率	%	96.0 (H27)	95.0	96.7				100
	A 1	消防職員救助技術研修受講者数	人	3 (H27)	8	9				17 以上
	A 2	住宅用火災警報器の設置率	%	71 (H27)	76	62				100
	A 3	消防水利設置状況数	基	673 (H27)	682	685				700 以上
	B 1	普通救命講習・救命入門コース受講者数	人	5,803 (H27)	6,405	7,269				8,000 以上
	B 2	近隣自治体平日夜間二次（外科）病院数	か所	0 (H27)	0	0				4 以上
3 生活安全	A 1	防犯に係る講演会や講座等の開催回数	回	4 (H26)	4	7				5 以上
	B 1	交通安全教室等の開催回数	回	2 (H26)	4	3				5 以上
	B 2	放置自転車台数	台	33 (H26)	32	16				15 以下
	B 2	歩道整備延長	m	13,001 (H26)	13,001	13,001				14,000 以上
	C 1	各種消費生活講座の開催	回	1 (H27)	2	5				3 以上

子どもを育てやすい環境づくりの推進										
部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
子ども・子育て支援	A1	出生数	人	169 (H26)	186	201				200 以上
	A1	合計特殊出生率	-	1.18 (H26)	1.36	未公表				1.28 以上
	A2	子育て支援センター設置数	か所	1 (H27)	1	1				2
	A3	児童発達支援施設数	か所	0 (H27)	0	0				1
	A4	放課後子ども教室の実施回数	回	57 (H27)	59	58				80
	A5	転入世帯数(25歳～39歳)	人	468 (H27)	483	475				500 以上

高齢者の生きがいづくりの推進										
部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
生きがいづくりと社会参加	A1	生きがいマップ登録団体数	件	116 (H27)	116	106				120 以上
	A2	65歳以上の生涯学習人材登録制度等の登録者数	人	50 (H27)	55	55				55 以上
	A3	おおいそシニア教室の参加者数	人	85 (H27)	55	52				100 以上
	B1	シルバー人材センター会員登録者数	人	135 (H27)	133	126				160 以上

健康づくりの推進										
部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
保健・医療	A1	健康づくりに関する団体に所属する人の延べ人数	名	96 (H27)	131	120				120 以上
	A2	4か月児健康診査受診率	%	98.3 (H27)	99.5	99.0				100
	A3	大腸がん検診の受診率	%	27.7 (H27)	32.7	33.7				40 以上
	B1	休日急患当番医制対応医療機関数	施設	24 (H27)	24	24				24 以上
	B2	予防接種の接種率(麻しん風しん第2期)	%	95.1 (H27)	95.7	96.4				100
健康スポーツ	A1	スポーツ教室・町体育協会主催大会数	回	398 (H27)	372	425				420 以上
	A2	スポーツ指導者バンク登録者数	人	15 (H27)	11	11				20 以上
	A3	学校施設開放利用者数	人	2,398 (H27)	2,448	2,345				2,500 以上

こころとふれあう福祉社会の充実

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
8 地域福祉	A1	日常生活自立支援事業利用人数	人	13 (H27)	12	12				15
	A2	ボランティア団体数	団体	30 (H27)	29	28				32 以上
	B1	バリアフリー化された公園トイレ数	か所	4 (H27)	7	7				7 以上
	B2	生活保護受給世帯数	世帯	149 (H27)	183	168				155
9 障がい者福祉	A1	地域での日常生活が困難な施設入所者数	人	42 (H27)	40	38				38 以下
	A2	障がい者雇用率（平塚職業安定所管内）	%	1.68 (H26)	1.84	1.93				2.0 以上
	A3	成年後見制度利用支援数	件	1 (H27)	1	1				3
10 高齢者福祉	A1	生活支援コーディネーター配置人数	人	0 (H27)	1	1				2
	B1	65歳以上の要支援、要介護認定者の割合	%	16.5 (H27)	16.0	15.6				19 以下
	B2	認知症サポーターの人数	人	1,496 (H27)	1,790	2,079				3,000 以上
11 保険・年金	A1	一人当たりの医療給付費（国民健康保険）	円	264,000 (H27)	285,765	296,410				294,000 以下
	A2	一人当たりの医療給付費（後期高齢者医療保険）	円	780,000 (H26)	796,288	815,285				810,000 以下
	A3	国民年金の被保険者数	人	6,962 (H27)	6,599	6,167				7,500
	A4	一人当たりの介護給付費	円	1,620,000 (H27)	1,450,000	1,494,000				1,700,000 以下

柱2 町民の力や知恵が集まるまちづくり

交流とひろばづくりの推進

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
1 町民参画・交流	A1	自治基本条例の認知度	%	17 (H21)	34.2 (H26)	次回調査予定は、 H30頃総計アンケート				30 以上
	A2	町民活動団体数	団体	22 (H27)	23	24				30 以上
	A3	町民活動推進補助金申請件数	件	6 (H27)	5	7				10 以上
	B1	地域会館稼働率	%	72 (H25)	66	66				77 以上
	B2	国外姉妹都市への高校生派遣人数	人	2 (H27)	2	3				4

開かれた町政と情報化の推進

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
2 広報・広聴と情報化	A1	町ホームページのアクセス数	回	540,000 (H27)	610,418	799,216				600,000 以上
	B1	施設予約システム利用施設数	施設	6 (H27)	6	6				8 以上
	B2	職員向けセキュリティ研修会の開催	回	1 (H27)	1	1				3 以上
	C1	情報公開請求率	%	0.303 (H27)	0.503	0.552				0.242
	C2	事故漏えい件数	件	0 (H27)	0	4				0

効率的な行財政の運営

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
3 行財政運営	A1	歳入増・歳出減の効果額 (平成27年比)	百万円	- (H27)	122	集計中				2,872 以上
	A2	町職員数	人	260 (H27)	263	257				260
	A3	経常収支比率	%	85.9 (H27)	87.2	集計中				85.9

柱3 人と自然が共生する循環のまちづくり

身近な自然環境空間の形成

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
1 自然環境	A1	有害鳥獣駆除件数	件	18 (H27)	279	177				15 以下
	A2	里山整備の面積	ha	71.4 (H27)	71.4	71.4				280 以上
	B1	保存樹木	本	13 (H27)	13	13				20 以上
	B1	保存樹林指定数	ha	14.8 (H27)	14.8	14.8				14.8 以上
	B2	一人当たりの施設緑地の面積	m ² /人	47.45 (H27)	57.32	57.32				51.99 以上
	B3	風致地区数	か所	1 (H27)	1	1				2 以上
2 公園	A1	一人当たりの都市公園面積	m ² /人	9.67 (H27)	9.95	9.95				37.22 以上
	A2	里親（アダプト）制度対象公園緑地数	か所	6 (H27)	6	6				8 以上
	A3	公園施設利用者	人	60,176 (H27)	105,658	106,493				67,000 以上
3 海岸	A1	海岸清掃活動回数	件	147 (H27)	97	112				155 以上
	B1	海水浴場・ビーチスポーツ利用者数	人	89,700 (H27)	85,100	61,880				107,600 以上
	C1	津波避難訓練の参加者数	人	3,035 (H27)	2,660	(訓練日と選挙投票日が重なったため未実施)				5,000 以上

良好な地域環境の形成

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
4 環境保全	A1	環境測定調査（大気）測定	-	環境基準値 以下 (H26)	環境基準値 以下	環境基準値 以下				環境基準値 以下
	A2	スマートエネルギー設置補助件数（H26年度以降累計）	件	23 (H26)	52	64				170 以上
	B1	不法投棄件数	件	29 (H26)	14	25				0
	B2	狂犬病予防接種率	%	85.5 (H27)	83.9	87.1				90.0 以上
5 河川・生活排水	A1	準用河川整備率	%	94 (H27)	94	98				100
	A2	環境測定調査（河川）測定	-	環境基準値 以下 (H27)	環境基準値 以下	環境基準値 以下				環境基準値 以下
	B1	下水道処理人口普及率	%	70.1 (H26)	75.3	76.8				87.6 以上
	B2	合併処理浄化槽補助件数（累計）	基	2 (H27)	3	3				12 以上

循環型地域社会の形成

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
6 廃棄物処理	A1	一人1日当たりのごみ排出量	g	895 (H26)	959	集計中				882 以下
	A2	資源化率	%	34.6 (H26)	29.6	集計中				31.8 以上
	A3	ごみ処理広域化計画の大磯町の施設稼働数	施設	1 (H27)	1	1				2
	A4	処理水の水質状況	-	施設設定値 範囲内 (H27)	施設設定値 以内	施設設定値 以内				施設設定値 以内

柱4 心豊かな人を育てるまちづくり

次代を担う人づくりの形成

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
1 保育・幼児教育	A1	1園当たりの英語指導助手による教育・保育の実施回数	回	9 (H27)	9	9				18 以上
	A2	認定こども園の設置数	園	0 (H27)	1	1				2
2 学校教育	A1	国語の授業が分かる と回答した生徒の割合 (中学3年生)	%	82.3 (H27)	56.2	69.6				85 以上
	A1	数学の授業が分かる と回答した生徒の割合 (中学3年生)	%	77.9 (H27)	67.2	74.6				80 以上
	A2	「中学校卒業後自主的に運動したい」と回答した生徒の割合(男子)	%	59.7 (H27)	65.9	66.1				66.5 以上
	A2	「中学校卒業後自主的に運動したい」と回答した生徒の割合(女子)	%	48.5 (H27)	41.7	66.7				50.6 以上
	A3	いじめの解消率	%	82 (H27)	92	94				100
	B1	学校図書館図書標準達成率	%	93.4 (H27)	86.6	87.8				100
	B2	地場産食材の使用割合 (小学校)	%	24.6 (H27)	22.6	20.0				30 以上
3 青少年	A1	青少年指導者研修参加延べ人数	人	10 (H27)	9	8				13 以上
	A2	青少年関連行事開催数	回	8 (H27)	8	6				10 以下
	A3	ファミリー教室開催数	回	3 (H27)	3	3				4

ゆとりを育む生涯学習の推進

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
4 生涯学習	A1	アンケート調査実施回数	回	0 (H27)	0	1				1
	A2	生涯学習施設来館者数	人	220,000 (H27)	229,000	328,300				230,000 以上
	B1	講座アンケート実施数	回	22 (H27)	23	26				27
	B2	人材活用講座開催回数	回	6 (H27)	3	3				8

誰もが尊重される社会づくりの形成

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
5 人権・男女共同参画	A1	人権に関する講演会・研修の参加者数	人	71 (H27)	84	62				100 以上
	B1	男女平等の意識調査 (男女平等の回答の割合)	%	47 (H19)	36 (H27)	-				75 以上
	B2	審議会・協議会への女性参加率	%	34.4 (H26)	25.7	26.4				40 以上

地域に根ざした文化の継承と創造

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
6 文化・文化財	A 1	おおいそ文化祭・美術展の来場者数	人	2,200 (H27)	2,806	1,847				2,300 以上
	B 1	指定文化財件数	件	45 (H27)	47	47				47 以上

柱5 個性と魅力と活力のあるまちづくり

魅力ある空間の形成

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
1 土地利用	A1	地区計画指定箇所数	か所	2 (H27)	0	2				5 以上
	A2	地区まちづくり計画の策定数	件	1 (H27)	0	1				2 以上
	A3	風致地区の数	か所	1 (H27)	1	1				2 以上
2 住宅・住環境	A1	緑陰住宅地として確保する面積	ha	69.08 (H27)	69.08	69.08				136 以上
	A2	住宅の耐震化率	%	67.83 (H27)	70.29	71.16				81.7 以上
	A3	地区計画、建築協定、緑地協定の件数	件	8 (H27)	0	8				10 以上
3 景観形成	A1	景観地区の指定箇所数	か所	0 (H27)	0	0				1 以上
	B1	風致地区の指定面積	ha	11 (H27)	11	11				95.8 以上
	B2	歴史的建造物等の指定箇所数	か所	4 (H27)	3	3				6 以上

快適に移動できる交通基盤の推進

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
4 道路・交通	A1	主要幹線道路整備路線数	路線	0 (H27)	0	0				1
	A2	橋りょう長寿命化実施済の橋りょう数	橋	3 (H27)	3	3				9
	A3	狭あい道路整備延長	m	21,073 (H27)	21,393	21,568				23,000 以上
	B1	補助路線バス利用者数	人	25,000 (H27)	22,707	23,468				27,000 以上
	B2	新たな公共交通の導入数	件	0 (H27)	1	1				2

活力と個性あふれる産業の振興

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
5 農業	A 1	認定農業者数	人	27 (H27)	26	17				30 以上
	A 1	年間新規就農者数	件	2 (H27)	4	5				4 以上
	B 1	重点作物選定数	件	0 (H27)	0	1				3 以上
	B 2	廃棄物・排泄物の有効利用 件数	件	3 (H27)	3	3				5
	B 3	学校給食での大磯産農産物 の使用量	kg	9,000 (H27)	5,396	2,291				9,500 以上
	C 1	耕作放棄地面積	ha	12.6 (H27)	12.7	13.0				12.0 以下
6 漁業	A 1	年間漁獲量	t	294 (H27)	267	507				350 以上
	A 2	定置漁獲量	t	270 (H27)	250	490				300 以上
	A 3	「さかなの朝市」開催回数	回	6 (H27)	4	6				10 以上
7 商工業・ 勤労者福祉	A 1	町内商工業者の金融対策支 援利用件数	件	40 (H27)	48	65				45 以上
	A 2	大磯逸品の会登録店舗数	店舗	11 (H27)	12	12				15 以上
	B 1	町内事業所数	か所	1,192 (H27)	1,139	1,066				1,250 以上
	C 1	勤労者の金融対策支援件数	件	27 (H27)	31	32				30 以上

資源を生かした特色ある観光の振興

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
8 観光	A 1	年間観光客数	万人	85.8 (H26)	86.0	91.7				100 以上
	A 2	民間団体による観光関連事 業数	回	30 (H27)	39	45				45 以上
	A 3	町有観光施設来場者数	人	39,828 (H27)	48,721	56,731				48,000 以上

**大磯町総合計画後期基本計画
+
大磯町人口ビジョン・総合戦略
実施計画進行管理書
【平成29年度】**

神奈川県大磯町政策課
〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183
TEL0463(61)4100 内線205・229
