

ふどうがわ

二級河川 不動川【国府橋架替】河川工事 の 進捗状況のお知らせ


日頃から、県河川行政の推進に、ご理解・ご協力をいただきありがとうございます。
神奈川県と大磯町では二級河川不動川の河川(断面)を広げる護岸改修工事と合わせて国府橋の架替工事を令和5年11月より実施しております。これらの工事は、令和7年3月末までの長期に及ぶ期間を要することから、**現在の工事の進捗状況についてお知らせいたします。**

令和6年10月末時点では、国府橋の下部工事(橋の基礎部分)及び河川護岸工事が概ね完了いたしました。11月以降は国府橋の上部工事(橋の桁部分等)に取り掛かり、予定どおり令和7年3月末完成を目指し、引き続き工事を進めてまいります。

なお、橋架替工事完了後はバスや一般車両の通行が可能となります。通行可能となる具体的な日時等につきましては、改めてお知らせいたします。

工事期間中はご不便、ご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解ご協力をお願いします。

◆工事進捗状況写真(令和6年10月末時点)

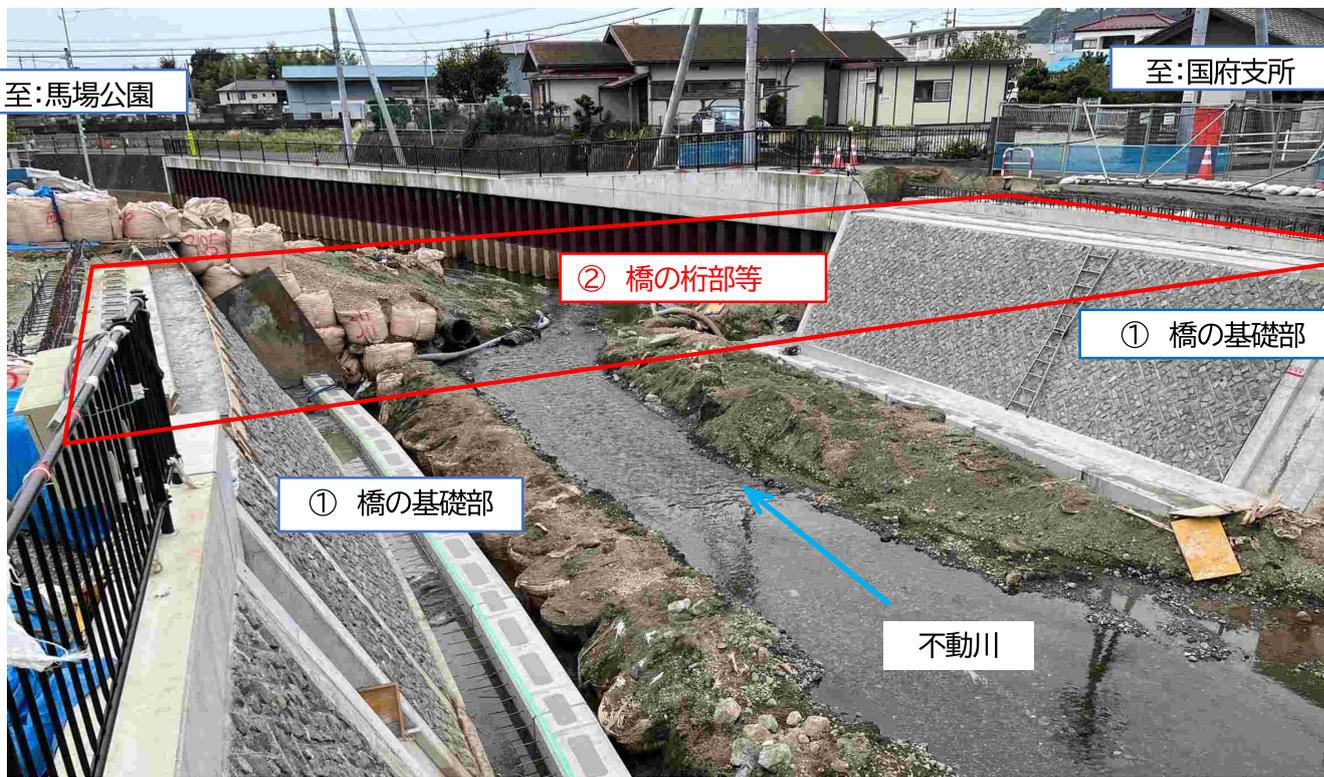


① 令和6年10月で下部工事(橋の基礎部分)及び護岸工事が概ね完了いたしました。

② 令和6年11月から上部工事(橋の桁部分等)の着手を予定しております。

◆完成までの流れ(11月～)

施工・完成イメージ図


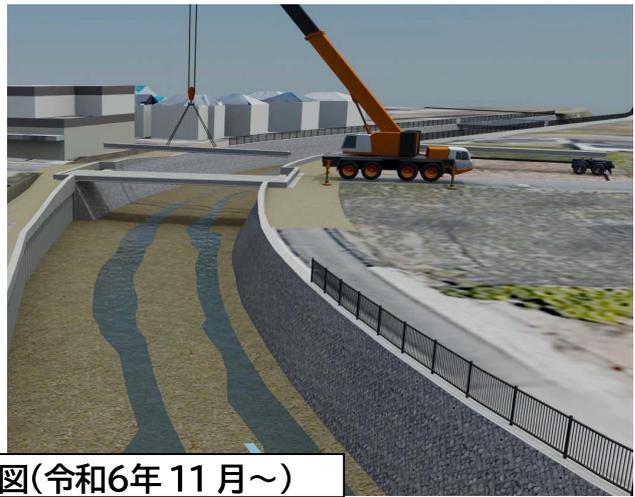


橋桁工事イメージ図(令和6年11月～)

令和6年11月～令和7年3月は主にクレーンによる橋桁架設工事、橋付帯工事を予定しています。



国府橋完成イメージ(令和7年3月末)

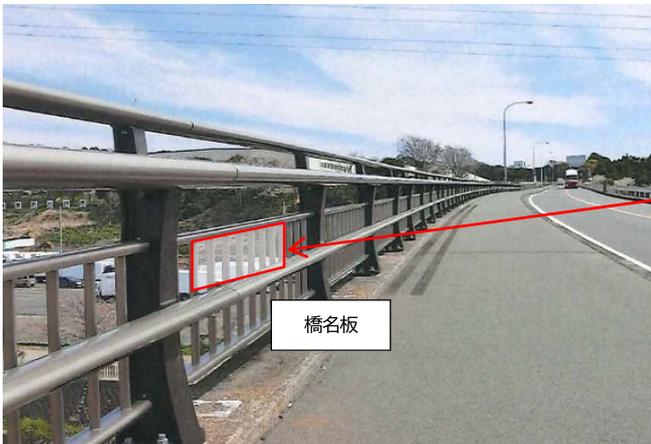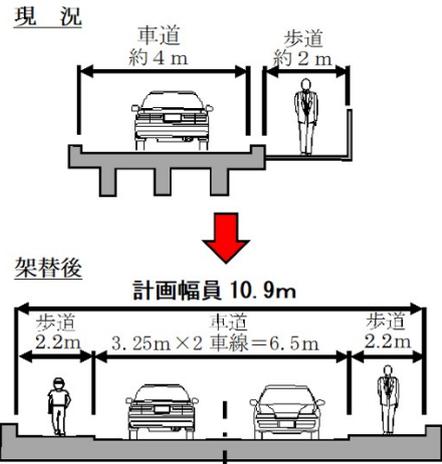

車両防護柵完成イメージ写真
(※他工事完成写真)



橋名板イメージ

国府橋架替後の令和7年4月以降についても、大磯町による国府橋周辺の道路工事及び下水道工事を行う予定となっております。工事に伴う交通規制等は改めてお知らせいたします。
