

新庁舎のネットワーク及びシステム の整備について

令和7年4月18日

大磯町 政策総務部 政策課



【新庁舎】対象のネットワークとシステム

ネットワーク

- 庁内系ネットワーク：行政事務を行うために通常使用するネットワーク
- 基幹系ネットワーク：個人番号利用事務を行うためのネットワーク
 - ※ 住民票、税、子育て、福祉等の事務
- 公衆無線LAN（Wi-Fi）：町民がインターネットを利用するためのネットワーク
 - ※ 1F：ロビー、4F：第一会議室、第一委員会室、第二委員会室

システム（現庁舎から移設）


- システム機器（70台程度（サーバ機器、ネットワーク制御機器等））
- パソコン（400台程度）およびプリンタ（70台程度）
- クラウド利用サービス（ネットワーク接続の切替等）

(令和11年10月末予定) 新庁舎供用開始まで

現庁舎



新庁舎

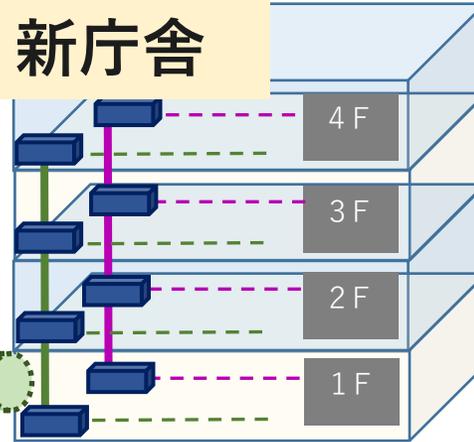

仮設ネットワーク


1. 【新庁舎】
ネットワーク整備
2. 【現庁舎-新庁舎 間】
仮設ネットワーク敷設

(令和11年11月~12年2月) 事務室移転

現庁舎



新庁舎

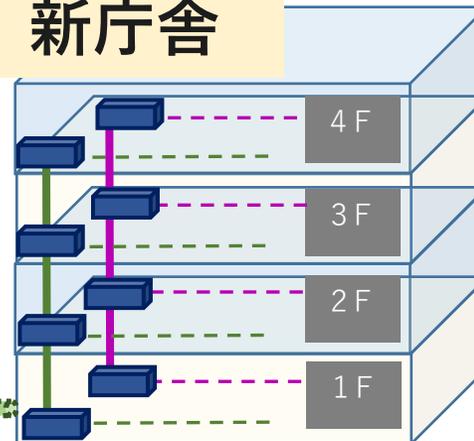

執務室移転

システム移設

執務室の移転にあわせ、
順次実施

1. ネットワーク切替
2. システム移設

実施工程

調査・設計業務

- **（現状調査・現庁舎）** ネットワーク構成、システム構成、業務調査 等
- **（設計）** 新ネットワーク概要設計、性能設計、ネットワーク整備設計、移行計画 等

ネットワーク整備

- **（設計）** ネットワーク詳細設計、ネットワーク敷設工事計画 等
- **（調達）** ネットワーク機器等の調達
- **（整備）** 新庁舎へのネットワーク整備、仮設ネットワーク整備 等

移 設

- **（ネットワーク）** 執務室（課ごと）移設にあわせたネットワーク切替
※新庁舎ネットワークの有効化、現庁舎ネットワークの無効化
- **（システム）** 現庁舎から新庁舎へのサーバ等機器の移設、システム環境の変更

概算費用

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 調査設計業務 | 約 3,000万円 |
| 2. ネットワーク整備 | 約 25,000万円 |
| 3. システム移設 | 約 2,000万円 |

合 計

約 30,000万円

ネットワーク関係スケジュール

R7

R8

R9

R10

R11

新庁舎

基本設計
実施設計

整備工事

庁舎
移転

実施設計と連携

整備工事完了まで
(2~3月前程度)

供用開始

ネットワーク等

調査・設計
業務

設計・調達

整備

移設

ネットワーク整備

【現庁舎】ネットワーク稼働

終了

平行稼働期間

【新庁舎】ネットワーク稼働
