

# 第二次新庁舎整備事業特別委員会 説明資料

令和6年8月19日

新庁舎整備について

---

## 資 料

---

- 1 今後の新庁舎整備事業について . . . . . 1～4
- 2 新庁舎整備事業 事業費について . . . . . 5～8
- 3 新庁舎整備事業の事業費（継続費）の見直し状況について . . . . . 9
- 4 令和6年度「新庁舎整備事業」継続費（変更）の内訳について . . . 10
- 5 新庁舎整備事業に係る事業費・財源内訳・町負担額の状況 . . . 11～13

議会事務局

# 1 今後の新庁舎整備事業について(1)

	基本計画	見直し (R5.10.20常任委協議会) (R6当初予算)	変更① (R6.7.11 特別委員会)	変更② (R6.9補正 計上予定)
①整備面積	5,000m <sup>2</sup>	5,000m <sup>2</sup>	5,500m <sup>2</sup>	
②建物構成	地上2F・4F 地下1F	地上2F・4F 地下無し	地上2F・4F 地下無し	
③津波対策	防護壁で受止め	行政機能2F以上へ	行政機能2F以上へ	
④事業範囲	ア設計・監理 イ新庁舎本体工事 ウ解体工事 エ立体駐車場整備	ア設計・監理 イ新庁舎本体工事 ウ解体工事	ア設計・監理 イ新庁舎本体工事 ウ解体工事 エ平面駐車場整備	
⑤事業手法	設計・工事別発注	設計施工一括発注	設計施工一括発注	

# 1 今後の新庁舎整備事業について(2)


	基本計画		見直し (R5.10.20常任委協議会) (R6当初予算)		変更① (R6.7.11特別委員会)		変更②(※) (R6.9補正計上予定)	
⑥事業費	44.4億円		32.5億円		43.6億円		43.6億円	
⑦整備時点 財源内訳	基金	14.0億円	基金	10.5億円	基金	14.0億円	基金	15.0億円
	地方債	30.4億円	地方債	22.0億円	地方債	21.6億円	地方債	28.6億円
	一般財源		一般財源	0.0億円	一般財源	8.0億円	一般財源	0.0億円
⑧町負担分 の状況	基金	14.0億円	基金	14.0億円	基金	14.0億円	基金	15.0億円
	町負担	30.4億円	交付税 措置	15.4億円	交付税 措置	10.8億円	交付税 措置	12.1億円
			町負担	3.1億円	町負担	18.8億円	町負担	16.5億円

※新庁舎整備事業については、令和6年9月議会にて、「変更②」に記載の内容に伴う継続費の補正（事業費・事業期間・財源）や基金積立に係る補正予算（案）を提案する予定です。



# 1 今後の新庁舎整備事業について(4)


## ⑩今年度のスケジュール

令和6年9月	9月議会定例会に関連する補正予算を提案 (議決を経て) 設計施工一括発注方式 事業者募集開始
	 事業者募集期間
12月	事業者募集締切
令和7年1月	書類審査 事業者によるプレゼン・審査・選定
2月	仮契約
3月	契約についての議案を提案 (3月議会定例会最終日を予定)


## 2 新庁舎整備事業 事業費について

### ①財源の見直し状況


変更① (R6.7.11 特別委時点)

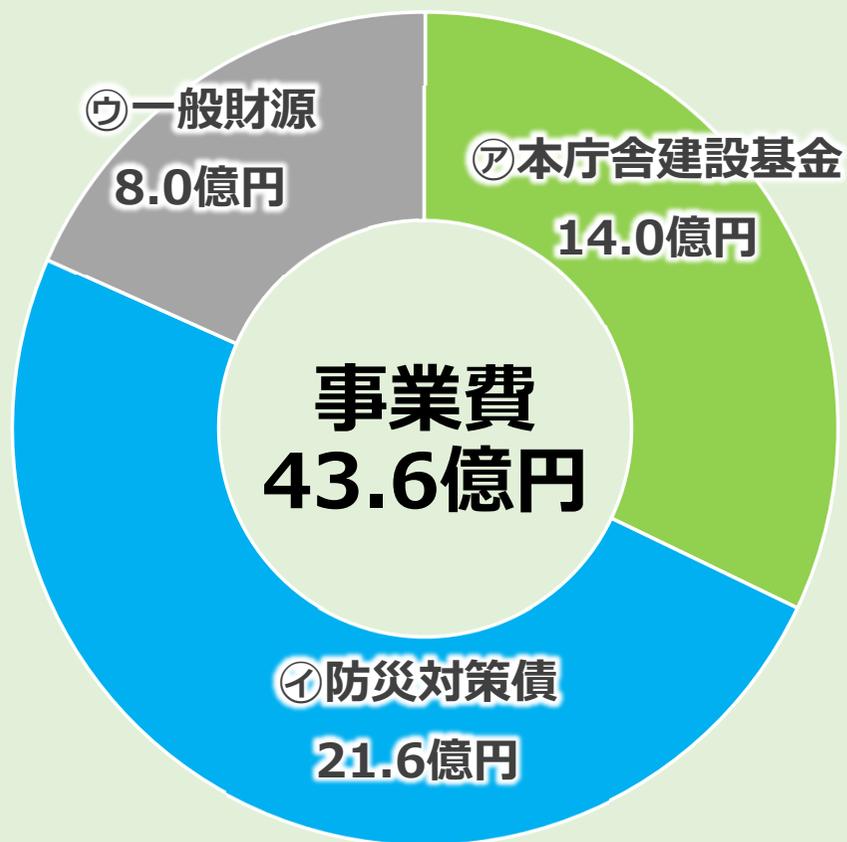

変更② (R6.9補正計上予定)

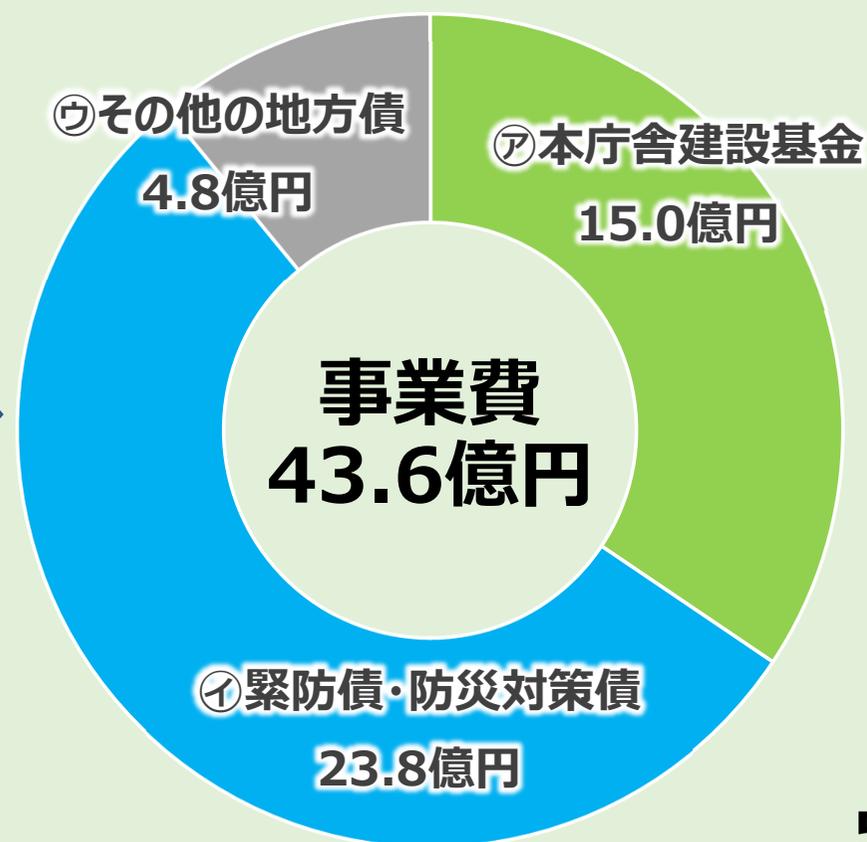

## ②「変更②」の財源内訳

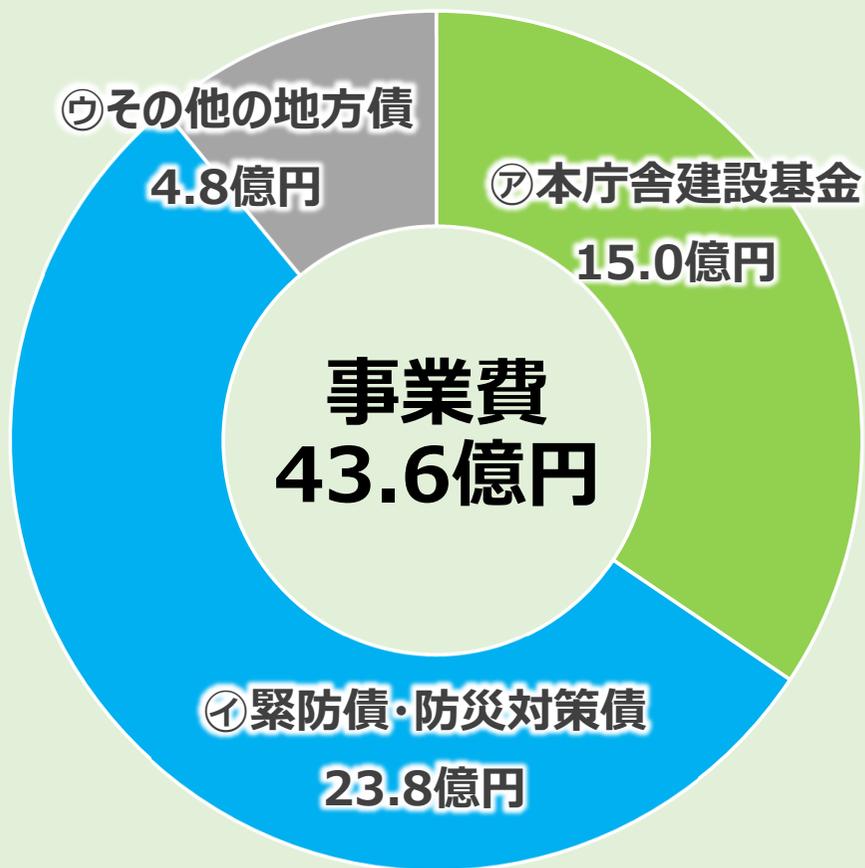


②ア 本庁舎建設基金 …… 15.0億円  
R6.8現在残高 14.0億円  
R6.9補正予算で1億円を積増しを予定  
→15.0億円へ

②イ 緊防債・防災対策債 …… 23.8億円  
対象職員数160人で想定  
R7事業分に緊防債を充当  
緊防債 0.8億円 (←0円)  
防災対策債 23.0億円 (←21.6億円)


②ウ その他の地方債 …… 4.8億円  
緊防債・防災対策債以外のメニュー活用  
一般財源→地方債へ  
事業期間中の町負担を平準化

### ③町負担分への効果


変更① (R6.7.11 特別委時点)

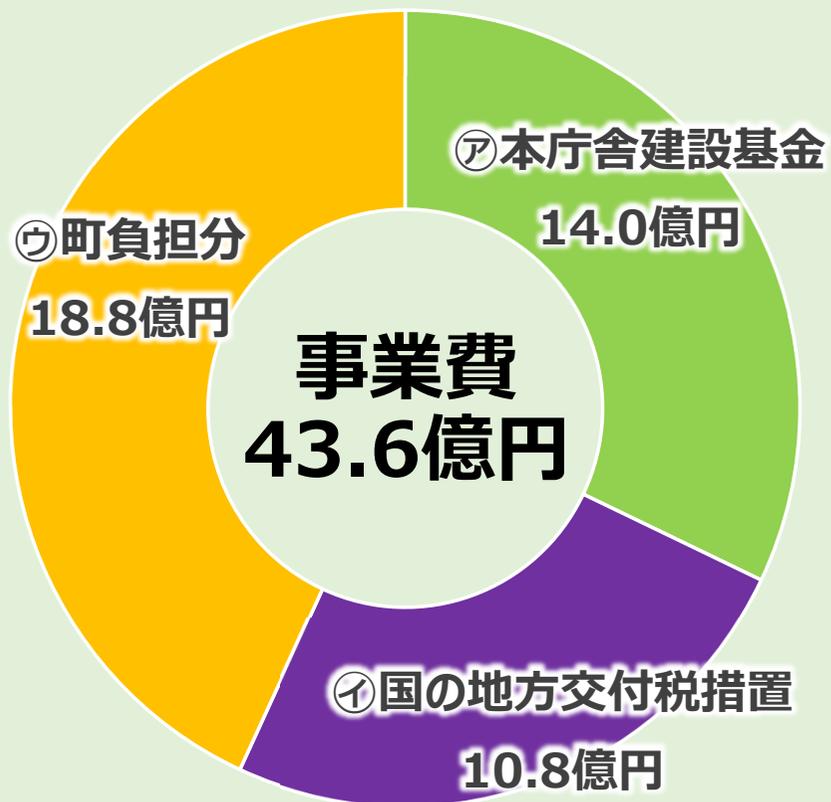

変更② (R6.9補正計上予定)

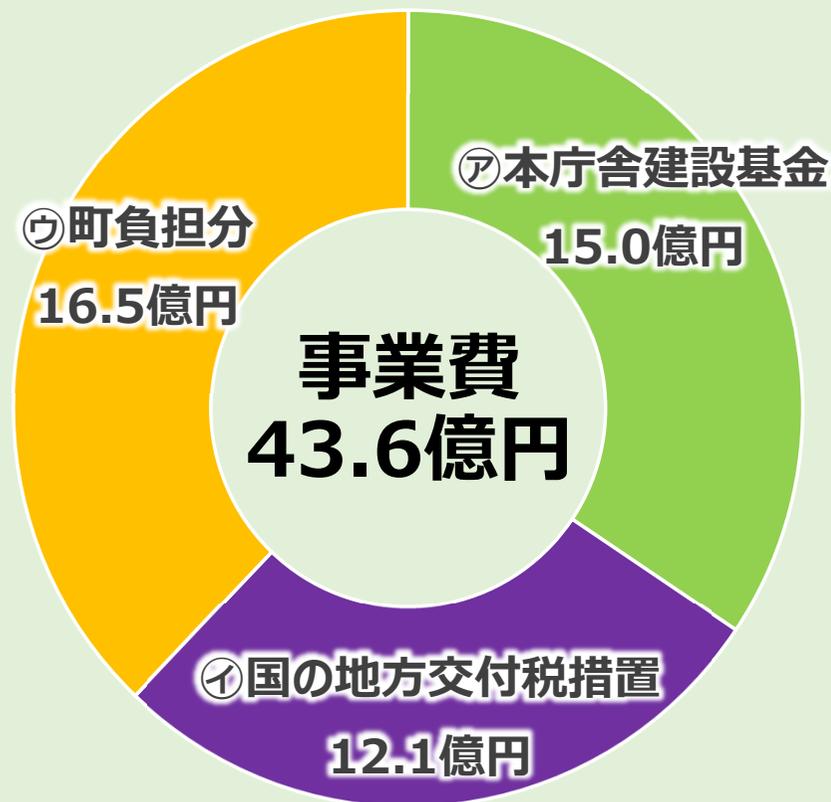

## ④町の負担分

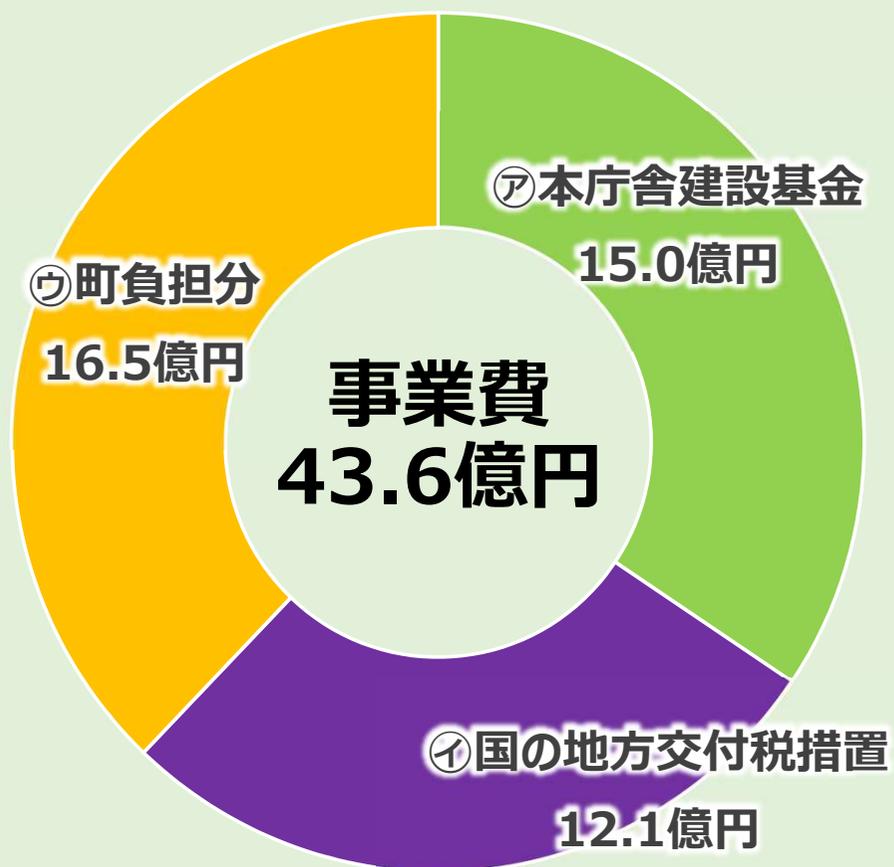

ア 本庁舎建設基金 …… 15.0億円

イ 国の地方交付税措置 …… 12.1億円  
緊防債・防災対策債への交付税措置  
緊防債分

$$0.8\text{億円} \times 70\% = 0.6\text{億円} (\leftarrow 0\text{円})$$

防災対策債分

$$23.0\text{億円} \times 50\% = 11.5\text{億円} \\ (\leftarrow 10.8\text{億円})$$

ウ 町負担分 …… 16.5億円

緊防債・防災対策債と交付税措置の差額

$$23.8\text{億円} - 12.1\text{億円} = 11.7\text{億円}$$

その他の地方債の負担分 4.8億円

3 新庁舎整備事業の事業費（継続費）の見直し状況について【令和6年8月現在（令和6年9月補正予算計上予定）】

〇㎡単価：65万円、整備面積：5,500㎡

① 令和6年度当初予算計上時点（単位：千円）

予算科目	総額	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	6～8合計
設計監理委託料	221,100	146,120	71,880	3,100				221,100
内訳① 基本設計	42,220	42,220						42,220
内訳② 実施設計	143,880	100,710	43,170					143,880
内訳③ 工事監理	35,000	3,190	28,710	3,100				35,000
内訳④ オフィスレイアウト業務	0							
工事請負費	3,028,900	282,000	2,538,000	208,900				3,028,900
内訳① 新庁舎整備工事	2,820,000	282,000	2,538,000					2,820,000
内訳② 既存施設解体工事	208,900			208,900				208,900
内訳③ 外構・駐車場整備工事	0							0
計	3,250,000	428,120	2,609,880	212,000				3,250,000

② 予算見直し後（単位：千円）

予算科目	総額	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	6～11合計
設計監理委託料	336,600	0	134,640	147,708	41,118	5,874	7,260	336,600
内訳① 基本設計	50,600		50,600					50,600
内訳② 実施設計	210,100		84,040	126,060				210,100
内訳③ 工事監理	66,000			11,748	41,118	5,874	7,260	66,000
内訳④ オフィスレイアウト業務	9,900			9,900				9,900
工事請負費	4,026,580	0	0	715,000	2,502,500	585,884	223,196	4,026,580
内訳① 新庁舎整備工事	3,575,000			715,000	2,502,500	357,500		3,575,000
内訳② 既存施設解体工事	285,480					228,384	57,096	285,480
内訳③ 外構・駐車場整備工事	166,100						166,100	166,100
計	4,363,180	0	134,640	862,708	2,543,618	591,758	230,456	4,363,180

③ 差引増減（2-1）（単位：千円）

予算科目	総額	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	6～11合計
設計監理委託料	115,500	△ 146,120	62,760	144,608	41,118	5,874	7,260	115,500
内訳① 基本設計	8,380	△ 42,220	50,600	0	0	0	0	8,380
内訳② 実施設計	66,220	△ 100,710	40,870	126,060	0	0	0	66,220
内訳③ 工事監理	31,000	△ 3,190	△ 28,710	8,648	41,118	5,874	7,260	31,000
内訳④ オフィスレイアウト業務	9,900	0	0	9,900	0	0	0	9,900
工事請負費	997,680	△ 282,000	△ 2,538,000	506,100	2,502,500	585,884	223,196	997,680
内訳① 新庁舎整備工事	755,000	△ 282,000	△ 2,538,000	715,000	2,502,500	357,500	0	755,000
内訳② 既存施設解体工事	76,580	0	0	△ 208,900	0	228,384	57,096	76,580
内訳③ 外構・駐車場整備工事	166,100	0	0	0	0	0	166,100	166,100
計	1,113,180	△ 428,120	△ 2,475,240	650,708	2,543,618	591,758	230,456	1,113,180

4 令和6年度「新庁舎整備事業」継続費（変更）の内訳について（令和6年度予算見直し m<sup>2</sup>単価65万円、整備面積5,500m<sup>2</sup>、対象職員160人の場合）

【令和6年8月現在（令和6年9月補正予算計上予定）】

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調査

	m <sup>2</sup> 単価 65万円	面積 5,500m <sup>2</sup>										
緊防債(防災対策債)対象事業費上限	2,643,200千円	対象職員数 160人										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">緊防債（防災対策債）の対象事業費上限の算定</th> </tr> <tr> <td>対象職員数</td> <td>160人</td> </tr> <tr> <td>標準面積</td> <td>35.3 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>m<sup>2</sup>単価</td> <td>468千円</td> </tr> <tr> <td>起債対象事業費上限</td> <td>2,643,200千円</td> </tr> </table>			緊防債（防災対策債）の対象事業費上限の算定		対象職員数	160人	標準面積	35.3 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> 単価	468千円	起債対象事業費上限	2,643,200千円
緊防債（防災対策債）の対象事業費上限の算定												
対象職員数	160人											
標準面積	35.3 m <sup>2</sup>											
m <sup>2</sup> 単価	468千円											
起債対象事業費上限	2,643,200千円											

(単位 千円)

款	項	事業名	年度	年割額	「年割額」に計上した予算科目 (A)	(A)に計上(見込)の予算額 (B)	(B)の内容の詳細 (C)	(C)の計上額	左の財源内訳						一般財源	備考(財源充当の整理)		
									特定財源									
									国(県)支出金	地方債計	地方債			基金				
											緊急防災(100%)	防災対策(90%)	その他(75%)					
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎整備事業	7	134,640	設計監理委託料	134,640	基本設計	50,600	(a)					50,600	0	全額基金を充当。		
					実施設計		84,040	(b)	84,000	84,000			40	0	緊防債【(b) * 充当率100%=84,000】を充当。残りは基金を充当。			
					計(=年割額)	134,640	計(=年割額)	134,640	0	84,000	84,000	0	0	50,640	0			
			8	862,708	設計監理委託料	147,708	実施設計	126,060	(c)	113,400	113,400			12,660	0	防災対策債【(c) * 充当率90%=113,400】を充当。残りは基金を充当。		
					工事監理	11,748	(d)	10,600	10,600			1,148	0	防災対策債【(d) * 充当率90%=10,600】を充当。残りは基金を充当。				
					オフィスレイアウト業務	9,900	(e)					9,900	0	全額基金を充当。				
					工事請負費	715,000	新庁舎整備工事	715,000	(f)	643,500	643,500			71,500	0	防災対策債【(f) * 充当率90%=643,500】を充当。残りは基金を充当。		
					計(=年割額)	862,708	計(=年割額)	862,708	0	767,500	0	767,500	0	95,208	0			
			9	2,543,618	設計監理委託料	41,118	工事監理	41,118	(g)	37,000	37,000			4,118	0	防災対策債【(g) * 充当率90%=37,000】を充当。残りは基金を充当。		
					工事請負費	2,502,500	新庁舎整備工事	2,502,500	(h)	1,850,100	1,498,700	351,400	652,400	0	対象事業費の上限に達するため、防災対策債分とその他の地方債分に分割			
							うち防災対策債分	1,665,234	(i)	1,498,700	1,498,700		166,534	0	防災対策債【(i) * 充当率90%=1,498,700】を充当(上限到達)。残りは基金を充当。			
							うちその他の地方債分	837,266	(j)	351,400		351,400	485,866	0	地方債は「その他の地方債(発行可能額:(j) * 充当率75%=627,900)」を充当。地方債の充当は351,400とし、残りは基金を充当。一般財源の充当を抑える。			
			計(=年割額)	2,543,618	計(=年割額)	2,543,618	0	1,887,100	0	1,535,700	351,400	656,518	0					
			10	591,758	設計監理委託料	5,874	工事監理	5,874	(k)				5,874	0	全額基金を充当。			
					工事請負費	585,884	新庁舎整備工事	357,500	(l)				357,500	0	全額基金を充当。			
							既存施設解体工事	228,384	(m)				228,384	0	全額基金を充当。			
			計(=年割額)	591,758	計(=年割額)	591,758	0	0	0	0	0	591,758	0					
			11	230,456	設計監理委託料	7,260	工事監理	7,260	(n)				7,260	0	全額基金を充当。			
					工事請負費	223,196	既存施設解体工事	57,096	(o)				57,016	80	基金を充当(上限到達)。残りは一般財源で対応。			
							外構・駐車場整備工事	166,100	(p)	124,500			41,600	0	その他の地方債【(p) * 充当率75%=124,500】と基金を充当。一般財源の充当抑制。			
			計(=年割額)	230,456	計(=年割額)	230,456	0	124,500	0	0	124,500	105,876	80					
			計	4,363,180	設計監理委託料	336,600	基本設計	50,600	0	0	0	0	50,600	0				
							実施設計	210,100	0	197,400	84,000	113,400	0	12,700	0			
							工事監理	66,000	0	47,600	0	47,600	0	18,400	0			
							オフィスレイアウト業務	9,900	0	0	0	0	0	9,900	0			
					工事請負費	4,026,580	新庁舎整備工事	3,575,000	0	2,493,600	0	2,142,200	351,400	1,081,400	0			
							既存施設解体工事	285,480	0	0	0	0	0	285,400	80			
							外構・駐車場整備工事	166,100	0	124,500	0	0	124,500	41,600	0			
計(=年割額)	4,363,180	計(=年割額)	4,363,180	0	2,863,100	84,000	2,303,200	475,900	1,500,000	80								

緊防債・防災対策債の起債可能額	合計	緊防債	防災対策債
緊防債・防災対策債の対象事業費上限	2,643,200	84,040	2,559,160
充当率	-	100%	90%
起債可能額	2,387,200	84,000	2,303,200

地方債の償還に係る交付税措置と町の負担分の整理	緊防債	防災対策債	その他	地方債計
実際の起債額	84,000	2,303,200	475,900	2,863,100
交付税措置率	70%	50%	0%	-
交付税で措置される償還分	58,800	1,151,600	0	1,210,400
償還分における町の負担分	25,200	1,151,600	475,900	1,652,700

【緊急防災・減災事業債、防災対策事業債の充当の考え方】	歳出額	対象事業費上限	差引=他財源で充当
○緊急防災・減災事業債、防災対策事業債が充当可能な経費 : ①実施設計・②新庁舎整備工事・③工事監理(新庁舎分)			
○上記の歳出合計	3,480,466千円(7)		
○起債対象事業費の上限	2,643,200千円(4)		
○差引差額(7)-(4)	837,266千円→ほかの財源で充当する		
○歳出合計(7)が起債対象事業費の上限(4)を上回るため、R9年度の新庁舎整備工事を防災対策債分とその他に分ける。			
合計	3,480,466	2,643,200	837,266

整備期間の一般財源 +80 = 最終的な町の負担分 1,652,780 ← 1,883,180 (R6.7.11時点)

5 新庁舎整備事業に係る事業費・財源内訳・町負担額の状況

【1】令和6年度当初予算時点

(1) 予算の状況 整備㎡単価 564千円 整備面積 5,000㎡

予算科目	歳出総額	財源内訳					
		地方債 計	地方債			基金	一般財源
			緊急防災	防災対策	その他		
①設計監理委託料	221,100	175,780	175,780	0	0	45,320	0
内訳① 基本設計	42,220					42,220	0
内訳② 実施設計	143,880	143,880	143,880				0
内訳③ 工事監理	35,000	31,900	31,900			3,100	0
内訳④ オフィスレイアウト業務	0						0
②工事請負費	3,028,900	2,024,220	2,024,220	0	0	1,004,680	0
内訳① 新庁舎整備工事	2,820,000	2,024,220	2,024,220			795,780	0
内訳② 既存施設解体工事	208,900	0				208,900	0
内訳③ 外構・駐車場整備工事	0	0					0
計	3,250,000	2,200,000	2,200,000	0	0	1,050,000	0

(A)

※地方債のメニュー：緊急防災・減災事業債（充当率100% 交付税措置率70%）

(2) 緊防債・防災対策事業債の起債額の整理

①入居職員数(単位：人)	149
②標準面積(単位：㎡)	35.3
③㎡単価(単位：千円)	422
④起債対象事業費(単位：千円) (①×②×③)	2,200,000
⑤緊防債分	2,200,000
⑥緊防債の充当率	100%
⑦緊防債の起債額 (単位：千円)(⑤×⑥)	2,200,000
⑧防災対策債分(④-⑤)	0
⑨防災対策債の充当率	90%
⑩防災対策債の起債額 (単位：千円)(⑧×⑨)	0
⑪起債額の合計(単位：千円) (⑦+⑩)	2,200,000

(3) その他の地方債の整理

⑫その他の地方債 計 (単位：千円) (⑫+⑬)	0
-----------------------------	---

(4) 本庁舎建設基金の状況(単位：千円)

⑮基金取崩前の残高(概数)	1,400,000
⑯当初取崩額	1,050,000
⑰差引残額	350,000

(C)

(5) 交付税で措置される地方債償還金の状況

⑱緊防債の起債額(=⑦) (単位：千円)	2,200,000
⑲緊防債の交付税措置率	70%
⑳交付税で措置される緊防債の 償還分(単位：千円)(⑱×⑲)	1,540,000
㉑防災対策債の起債額(=⑩) (単位：千円)	0
㉒緊防債の交付税措置率	50%
㉓交付税で措置される防災対策債の 償還分(単位：千円)(㉑×㉒)	0
㉔交付税で措置される償還分 計 (単位：千円)(⑳+㉓)	1,540,000

(6) 町で負担する地方債償還金の状況

㉕緊防債の起債額(=⑦) (単位：千円)	2,200,000
㉖交付税で措置される緊防債の 償還分(単位：千円)(=⑳)	1,540,000
㉗町で負担する緊防債の 償還分(単位：千円)(㉕-㉖)	660,000
㉘防災対策債の起債額(=⑩) (単位：千円)	0
㉙交付税で措置される防災対策債の 償還分(単位：千円)(=㉓)	0
㉚町で負担する防災対策債の 償還分(単位：千円)(㉘-㉙)	0
㉛町で負担する緊防債・防災対策債 の償還分 計(単位：千円)(㉗+㉚)	660,000
㉜その他の地方債の償還分(=⑭) (単位：千円)	0
㉝町で負担する地方債の償還分 合計(単位：千円)(㉛+㉜)	660,000

(B)

(7) 最終的な町の負担分(単位：千円) (= (A) + (B) - (C))

310,000

【2】変更案① (R6. 7. 11特別委員会時点)

(1) 予算の状況 整備㎡単価 650千円 整備面積 5,500㎡

予算科目	歳出総額	財源内訳					
		地方債			基金	一般財源	
		地方債 計	緊急防災	防災対策			その他
①設計監理委託料	336,600	210,100	0	210,100	0	126,500	0
内訳① 基本設計	50,600					50,600	0
内訳② 実施設計	210,100	210,100		210,100			0
内訳③ 工事監理	66,000	0				66,000	0
内訳④ オフィスレイアウト業務	9,900					9,900	0
②工事請負費	4,026,580	1,949,900		1,949,900	0	1,273,500	803,180
内訳① 新庁舎整備工事	3,575,000	1,949,900		1,949,900		1,273,500	351,600
内訳② 既存施設解体工事	285,480	0					285,480
内訳③ 外構・駐車場整備工事	166,100	0					166,100
計	4,363,180	2,160,000	0	2,160,000	0	1,400,000	803,180

(追加)

(追加)

(A)

\*地方債のメニュー：防災対策事業債（充当率90% 交付税措置率50%）

(2) 緊防債・防災対策事業債の起債額の整理

①入居職員数(単位：人)	149
②標準面積(単位：㎡)	35.3
③㎡単価(単位：千円)	468
④起債対象事業費(単位：千円) (①×②×③)	2,400,000
⑤緊防債分	0
⑥緊防債の充当率	100%
⑦緊防債の起債額 (単位：千円)(⑤×⑥)	0
⑧防災対策債分(④-⑤)	2,400,000
⑨防災対策債の充当率	90%
⑩防災対策債の起債額 (単位：千円)(⑧×⑨)	2,160,000
⑪起債額の合計(単位：千円) (⑦+⑩)	2,160,000

(3) その他の地方債の整理

⑫その他の地方債 計 (単位：千円) (⑫+⑬)	0
-----------------------------	---

(4) 本庁舎建設基金の状況(単位：千円)

⑮基金取崩前の残高(概数)	1,400,000
⑯当初取崩額	1,400,000
⑰差引残額	0

(C)

(5) 交付税で措置される地方債償還金の状況

⑱緊防債の起債額(=⑦) (単位：千円)	0
⑲緊防債の交付税措置率	70%
⑳交付税で措置される緊防債の 償還分(単位：千円)(⑱×⑲)	0
㉑防災対策債の起債額(=⑩) (単位：千円)	2,160,000
㉒緊防債の交付税措置率	50%
㉓交付税で措置される防災対策債の 償還分(単位：千円)(㉑×㉒)	1,080,000
㉔交付税で措置される償還分 計 (単位：千円)(㉒+㉓)	1,080,000

(6) 町で負担する地方債償還金の状況

㉕緊防債の起債額(=⑦) (単位：千円)	0
㉖交付税で措置される緊防債の 償還分(単位：千円)(=㉒)	0
㉗町で負担する緊防債の 償還分(単位：千円)(㉕-㉖)	0
㉘防災対策債の起債額(=⑩) (単位：千円)	2,160,000
㉙交付税で措置される防災対策債の 償還分(単位：千円)(=㉓)	1,080,000
㉚町で負担する防災対策債の 償還分(単位：千円)(㉘-㉙)	1,080,000
㉛町で負担する緊防債・防災対策債 の償還分 計(単位：千円)(㉗+㉚)	1,080,000
㉜その他の地方債の償還分(=⑫) (単位：千円)	0
㉝町で負担する地方債の償還分 合計(単位：千円)(㉛+㉜)	1,080,000

(B)

(7) 最終的な町の負担分(単位：千円) (= (A) + (B) - (C)) 1,883,180

【3】変更案② (R6. 8. 19特別委員会時点 9月補正予算計上予定)

(1) 予算の状況 整備㎡単価 650千円 整備面積 5,500㎡

予算科目	歳出総額	財源内訳					基金	一般財源
		地方債				地方債 計		
		緊急防災	防災対策	その他				
①設計監理委託料	336,600	245,000	84,000	161,000	0	91,600	0	
内訳① 基本設計	50,600					50,600	0	
内訳② 実施設計	210,100	197,400	84,000	113,400		12,700	0	
内訳③ 工事監理	66,000	47,600		47,600		18,400	0	
内訳④ オフィスレイアウト業務	9,900					9,900	0	
②工事請負費	4,026,580	2,618,100	0	2,142,200	475,900	1,408,400	80	
内訳① 新庁舎整備工事	3,575,000	2,493,600		2,142,200	351,400	1,081,400	0	
内訳② 既存施設解体工事	285,480	0				285,400	80	
内訳③ 外構・駐車場整備工事	166,100	124,500			124,500	41,600	0	
計	4,363,180	2,863,100	84,000	2,303,200	475,900	1,500,000	80	

(追加)

(追加)

(A)

※地方債のメニュー R7年度：緊急防災・減災事業債（充当率100% 交付税措置率70%）

R8年度以降：防災対策事業債（充当率90% 交付税措置率50%）

その他の地方債（充当率75% 交付税措置なし）

(2) 緊防債・防災対策事業債の起債額の整理

①入居職員数(単位：人)	160
②標準面積(単位：㎡)	35.3
③㎡単価(単位：千円)	468
④起債対象事業費(単位：千円) (①×②×③)	2,643,200
⑤緊防債分 (R7実施設計分)	84,040
⑥緊防債の充当率	100%
⑦緊防債の起債額 (単位：千円)(⑤×⑥)	84,000
⑧防災対策債分 (④-⑤)	2,559,160
⑨防災対策債の充当率	90%
⑩防災対策債の起債額 (単位：千円)(⑧×⑨)	2,303,200
⑪起債額の合計 (単位：千円) (⑦+⑩)	2,387,200

(3) その他の地方債の整理

⑫R9新庁舎整備工事分 (単位：千円)	351,400
⑬R11外構・駐車場整備工事分 (単位：千円)	124,500
⑭その他の地方債 計 (単位：千円) (⑫+⑬)	475,900

(4) 本庁舎建設基金の状況 (単位：千円)

⑮基金取崩前の残高(概数)	1,500,000
⑯当初取崩額	1,500,000
⑰差引残額	0

(C)

(5) 交付税で措置される地方債償還金の状況

⑱緊防債の起債額 (=⑦) (単位：千円)	84,000
⑲緊防債の交付税措置率	70%
⑳交付税で措置される緊防債の 償還分(単位：千円)(⑱×⑲)	58,800
㉑防災対策債の起債額 (=⑩) (単位：千円)	2,303,200
㉒緊防債の交付税措置率	50%
㉓交付税で措置される防災対策債の 償還分(単位：千円)(㉑×㉒)	1,151,600
㉔交付税で措置される償還分 計 (単位：千円)(⑳+㉓)	1,210,400

(6) 町で負担する地方債償還金の状況

㉕緊防債の起債額 (=⑦) (単位：千円)	84,000
㉖交付税で措置される緊防債の 償還分(単位：千円)(=⑳)	58,800
㉗町で負担する緊防債の 償還分(単位：千円)(㉕-㉖)	25,200
㉘防災対策債の起債額 (=⑩) (単位：千円)	2,303,200
㉙交付税で措置される防災対策債の 償還分(単位：千円)(=㉓)	1,151,600
㉚町で負担する防災対策債の 償還分(単位：千円)(㉘-㉙)	1,151,600
㉛町で負担する緊防債・防災対策債 の償還分 計(単位：千円)(㉗+㉚)	1,176,800
㉜その他の地方債の償還分 (=⑭) (単位：千円)	475,900
㉝町で負担する地方債の償還分 合計(単位：千円)(㉛+㉜)	1,652,700

(B)

(7) 最終的な町の負担分 (単位：千円) (= (A) + (B) - (C)) 1,652,780
